



كۆماراڭ عىزراق
پاريزگاڭ كار كوك
باشلاڭ كاروباراڭ ياسايڭ
هۆبىڭ پروزه كان

جمهورية العراق
محافظة كركوك
قسم الشؤون القانونية
شعبة المشاريع

" لنجعل من الاهداف الإنمائية لسنة ٢٠١٢ تمكيناً لذوي الإعاقة في المجتمع "

التاريخ ٢٠١٣ / ١٤ / ٨

العدد ٧٦

عقد مقاوله

رقم العقد ٧٦ / ٢٠١٣

- اسم العمل :- مشروع (بناء مخزن جملوني في الحويجة - الدبس - دافوق) .
الطرف الاول/ الدكتور نجم الدين عمر كريم/ محافظ كركوك/ اضافة لوظيفته .
الطرف الثاني/ شركة (وجه الخير للمقاولات) مديرها المفوض (عبدالجبار احمد محمد) .
العنوان/ كركوك - عمارة الجدوع / الهاتف (٠٧٧١٨٥٨٠٤٢٦) .
١) اتفق الطرفان على ان يقوم الطرف الثاني بتنفيذ اعمال مشروع (بناء مخزن جملوني في الحويجة - الدبس - دافوق) ضمن خطة الوزارة الاستثمارية لسنة ٢٠١٣ (البالغ رقماً (٥٨٠,٧٣٢,٥٠٠) دينار وكتابة " (خمسمائة وثمانون مليون وسبعمائة واثنان وثلاثون الف وخمسمائة دينار) وفق الشروط والمواصفات الفنية المقررة والكشف المنظم بذلك والمخططات الخاصة بالمشروع وحسب ارشادات المهندس المشرف على العمل وتوصيات لجنة الاحالة .
٢) الطرف الثاني/ يتعهد بانجاز العمل مدة رقماً (٩٠) يوماً وكتابة (تسعون) يوماً اعتباراً من تاريخ المباشرة بالعمل وخلال مدة (٧) سبعة ايام من تاريخ توقيع العقد .
٣) الطرف الثاني/ يتحمل غرامة تاخيرية حسب الشروط العامة للمقاولات قدرها رقماً (٦٤٥,٢٥٨) دينار وكتابة " (ستمائة وخمسة اربعون الف ومائتان وثمانية وخمسون دينار) عن كل يوم تأخير .
٤) الطرف الثاني/ يتحمل مدة صيانة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ انجاز العمل .
٥) الطرف الثاني/ يتعهد بتسديد اجور الفحوصات المختبرية الفاشلة والناجحة .
٦) الطرف الثاني/ يتعهد برفع المواد الرفضية والغير الناجحة مختبرياً من موقع العمل حيث ان جميع المواد خاضعة للفحوصات المختبرية .
٧) الطرف الثاني/ يتعهد بتقديم التامينات النظامية وفق النسب المقررة قانوناً بشكل نقدي او صك مصدق او خطاب ضمان بالمبالغ المذكورة الى الطرف الاول .
٨) الطرف الثاني/ يلتزم بمراجعة دائرة احصاء كركوك لاعطاء المعلومات الخاصة بالمشروع .
٩) الطرف الثاني/ يلتزم بمراجعة دائرة الضمان في المحافظة لاعطاء المعلومات الخاصة بالمشروع .
١٠) الطرف الثاني/ يلتزم بمراجعة شركة التامين الوطنية في المحافظة لغرض التامين على المشروع .
١١) الطرف الثاني/ يتعهد بتنفيذ كل ما ورد في العقد وتعتبر بنود العقد مكتملة للشروط والمواصفات الخاصة باعمال الهندسة المدنية يقسمها الاول والثاني .
١٢) الطرف الثاني/ يلتزم بتعيين مهندس له خبرة في العمل المذكور اعلاه من قبله .
١٣) الطرف الثاني/ يتعهد بتهيئة دائرة للمهندس المقيم في موقع العمل .
١٤) في حالة عدم تنفيذ الطرف الثاني للمشروع فيتم تنفيذ المشروع على حسابه ويتحمل تحميلات ادارية مقدارها (٢٠ %) من قيمة المبلغ الاجمالي للمقاوله .
في حالة اخلال الطرف الثاني باي شرط من شروط العقد يعتبر العقد مفسوخاً دون الحاجة الى انذاره من قبل الدائرة لأي مدة كانت او اللجوء الى المحاكم المختصة ويتحمل في هذه الحالة كلفة انجاز المشروع عند احواله الى مقاول اخر او يتم تنفيذه من قبل الدائرة على حسابه وليس له الحق في المطالبة باعادة التامينات .
١٦) عدم صرف مبلغ الفقرات الغير متجانسة مع الكشف التخميني للمشروع المعد من قبل الدائرة لحين وصول نسبة الانجاز الكلي للمشروع الى ٥٠ % .
١٧) لاجوز تمديد فترة العمل بأي شكل من الاشكال الا اذا وجدت قوة قاهرة لا يمكن لأي طرف من الاطراف توقعها او بناء على اعدان قانونية صريحة وتحريرية .
١٨) لاجوز التنازل عن اعمال المشروع الا بموافقة الطرف الاول تحريرياً .
١٩) الطرف الاول/ له الحق في حذف واستحداث وكذلك الزيادة او النقصان في أي فقرة من فقرات الكشف وحسب ما يتطلبه العمل .
٢٠) تعتبر اية تعليمات تخص المشروع تصدر الى المقاول من الطرف الاول شروط " ملحقاً " بالعقد واجبة التنفيذ .
٢١) يتم استحصاال الديون وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧ .
ولقبول الطرفين جميع الشروط اعلاه وقع العقد بتاريخ ٢٠١٣ / ١٤ / ٥

الطرف الأول
الدكتور نجم الدين عمر كريم
محافظ كركوك اضافة لوظيفته
٢٠١٣ / /

الحقوقي
اركان لطيف علي
مدير قسم الشؤون القانونية
www.kirkuk.gov.iq



الطرف الثاني
شركة (وجه الخير للمقاولات)
العنوان/ كركوك - عمارة الجدوع

محافظة كركوك
قسم الشؤون القانونية
رقم الرسم المتوفي / ١٧٤٣٠٠٠
رقم العقد / ٢٠١٤٠٥٠٠٠
تاريخه ٢٠١٣ / ١١ / ٥
تسلسله في السجل /

العدد: ٩٢٩ / ٤٣
التاريخ: ٢٠٠٩ / ١٠ / ١٢ م
الموافق: ١٤٣٠ / / هـ



جمهورية العراق
وزارة النفط
شركة خطوط الأكييب النفطية
(شركة عامة)

(سري)

الى / شركة وجه الخير للمقاولات العامة
المدير المفوض / عبد الجبار احمد محمد
الحنون / بغداد / مجاور فندق ميريديان
رقم الهاتف / ٧٧٠٢٥٦٩٢٣٩

م/ لحالة المناقصة المرقمة (٢٠٠٩/٢٤)
الخاصة بـ (انشاء بناية مختبر في مستودع المشاهدة)

نود اعلامكم بأحالة المناقصة المرقمة أنفاً بعهدتكم ويسعر عطاءكم البالغ (٦٣٨٨٩٠٠٠) فقط
ثلاثة وستون مليوناً وثمانمائة وتسعة وثمانون الف لاغير وبمدة تنفيذ امدها (١٥٠) يوم اعتباراً
من تاريخ المباشرة بالعمل .

عليه يرجى حضوركم الى مقر الشركة في الدورة / القسم القانوني خلال ثلاثة ايام من استلامكم
كتابنا هذا لغرض توقيع العقد مستصحبين معكم التأمينات النظامية البالغ (١٩٤٤٥٠) فقط
ملايين ومائة واربعه وتسعون الف واربعمائة وخمسون دينار لاغير مع رسم الطابع
البالغ (١٢٧٧٧٨) فقط مائة وسبعة وعشرون الف وسبعمائة وثمانية وسبعون دينار لاغير يضاف
مبلغ (٩٥٠) دينار فقط تسعمائة وخمسون دينار لاغير عن الرسوم العدلية والنسخ الاضافية .
مع التقدير

هاشم عبد الغفور شاكر
المدير العام وكالة
رئيس مجلس الادارة

صلاح حسن علي
ع/ المدير العام

صورة منه الى/

- الهيئة العامة للضرائب / قسم الشركات .
- القسم المالي / شعبة العقود / للتفضل بالعلم . راجين اتخاذ مايلزم من قبلكم . مع التقدير .
- قسم الهندسة المدنية / للتفضل بالعلم . مع التقدير .
- قسم الدراسات والتخطيط والمتابعة / للتفضل بالعلم . مع التقدير .
- القسم القانوني / شعبة العقود / مع كافة الارليات لتنظيم العقد .
- الاضبارة .

ص.ب: 12009 الدورة - بغداد - العراق

هاتف: 7750313 تلكس: 213913 هاتف الفاكس: 7750002

Ministry of Agriculture
The State Company for Natural
Resources Services

Legal ٢٠١٠/١٦/٢١

تم توقيع العقد في بغداد المنسب

شركة
وجه الخير
للمقاولات العامة المحدودة

الطرف الثاني

شركة وجه الخير للمقاولات العامة المحدودة

المدير المفوض / او من يخوله

حسب القبول المرقم ١١٠٠/٢٠١٠

الطرف الاول

عامر صادق فهد

المدير العام للمديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائيه

لمنطقة الفرات الاعلى

٢٠١٠ / ١٠ / ٢١

رقم الهوية وتاريخها :- ٠٠٥٦٧٤١٠

تاريخ اصدارها :- ٢٠٠٩ / ٢ / ١٩

جهة الاصدار :- الرصافه

٢٠١٠ / ١٠ / ٢١

استوفي رسم الطابع نقداً عن هذا

الورقة ومقداره ٣٦٣.٨٩٥

وزارة
الكهرباء

مديرية
الطاقة
القانونية

صديق
١١/١٠



NO : GC \
DATE : \ \ 20

العدد : ع ح ١٣٤١ /
التاريخ : ١٩ / ١١ / ٢٠١٢

٤- مدة الانجاز //

(١٥٠ يوم) مائة وخمسون يوم تبدأ من تاريخ أمرالمباشرة بالعمل.

٥- الغرامات التأخير بـتة عن كل يوم تأخير //

(٥٧١٨٩٣ دينار) فقط خمسمائة وأحدى وسبعون الف وثمانمائة وثلاثة وتسعون دينار

٦- فترة الصيانة //

(سنة واحدة) من تاريخ الاستلام الاولي.

تفاصيل الرسوم والتأمينات وأجور الإعلان :-


• تأمينات حسن التنفيذ بمبلغ قدره (٤٧١٨١٢٠٠ دينار) فقط سبعة واربعون مليون ومائة واحد وثمانون الف ومئتان دينار وتمثل نسبة (٥%) من المبلغ الاجمالي (مبلغ الاحالة و ١٠% احتياط) وتكون على شكل خطاب ضمان أوصك مصدق أو كفالة مصرفية ضامنة (من مصرف عراقي معتمد).

• رسم الطابع المالي بمبلغ قدره (١٧١٥٦٨٠ دينار) فقط مليون وسبعمائة وخمسة عشر الف وستمائة وثمانون دينار وتمثل نسبة (٠,٠٠٠٢) اثنان بالالف من مبلغ الإحالة.

• رسم الطابع الهندسي بمبلغ قدره (٤٢٨٩٢٠ دينار) فقط أربعمائة وثمانية وعشرون الف وتسعمائة وعشرون دينار وتمثل نسبة (٠,٠٠٠٠٥) نصف بالالف من مبلغ الاحالة.

• رسم الطابع العللي بمبلغ قدرة (٥٠٠ دينار) فقط خمسمائة دينار عراقي لأغير.

• اجور الإعلان والنشر في الصحف المحلية.



أ.د. أمين دواي ثامر

رئيس الجامعة التكنولوجية

الجامعة التكنولوجية
شعبة
العقود الحكومية
الصادرة
العدد
التاريخ: / /

نسخة مئة إلى /

- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة الأعمار والمشاريع/ قسم العقود الحكومية
- وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي/ الجهاز المركزي للإحصاء ودائرة التشديد و التخطيط
- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية / دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي
- ديوان الرقابة المالية
- قسم الشؤون المالية
- وحدة التعاقدات / اضبارة المناقصة
- ملف الصادرة

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق

وزارة التخطيط

الجهاز المركزي للإحصاء / القسم القانوني

العراق - بغداد - العلوية

هاتف بدالة الجهاز: ٧١٧٤٣٨١

البريد الالكتروني: <http://www.iraqcosit.org>

التاريخ: ٢٠١٠/٨/٨

العدد: ١ / ٢ / ١٠ / ١٨٦٤ هـ

إلى / شركة وجه الخير
م / قرار إحالة

يهدىكم الجهاز المركزي للإحصاء أطيب تحياته

استناداً إلى موافقة معالي الوزير المحترم بتاريخ ٢٠١٠/٩/٣ على محضر لجنة العقود المركزية في وزارة التخطيط للقيام بإجراءات التعاقد وإحالة المناقصة رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ على شركتكم لغرض بناء شعبة إحصاء حديثة في محافظة الأنبار (مناقصة عامة) وبمبلغ قدره (٣٦٩,٨٨٤,٥٠٠) (ثلاثمئة وتسعة وستون مليون وثمانمئة وأربعة وثمانون ألف وخمسمائة دينار عراقي) وبمدة تنفيذ العمل (١٥٠) مئة وخمسون يوماً" لذا يرجى الحضور إلى مقر الجهاز المركزي للإحصاء / القسم القانوني خلال مدة (١٤) يوم من تاريخ الإحالة لتوقيع العقد وبعبءه تتحمل شركتكم كافة التبعات القانونية مستصحبين معكم التأمينات النهائية البالغة (٥%) من قيمة العطاء على شكل صك مصدق أو خطاب ضمان .

مع التقدير

د. مهدي محسن العلق
رئيس الجهاز المركزي للإحصاء



نسخة منه إلى /

- القسم القانوني / للمتابعة مع الشركة ... للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير .

والتي تدخل في نطاق أغراض الشركة .

أن تجري جميع المعاملات وتبرم كافة انواع العقود والتوقيع عليها وتدخل في مختلف أنواع التعبدات والمناقصات والمزايدات مع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية. وكذلك دوائر القطاع العام والمختلط وأشخاص قطيع اخص سواء كانت بمفردها او حسب الاشتراك مع الغير او حسب الغير وكذلك التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ تلك الأغراض وبالشروط التي تراها مناسبة .

الاشتراك مع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وبالشكل الذي تراه مناسباً لتحقيق هذه الأغراض بما في ذلك تأسيس شركات والاندماج فيها وشراء اسهمها وسندات استقراضها والاكتتاب فيها مع مراعاة أحكام القوانين الفذة بهذا الخصوص .

للمشركة الحق في فتح الاعتمادات الحسابات الجارية لدى المصارف وان تنشئ او تسحب أو تتقبل أو تتصرف بأي صورة أخرى بالأوراق التجارية والسندات لتقابلة للتداول بالأوراق المالية الأخرى من كمبيالات وحوالات وسندات شحن وغيرها مبنياً كان نوعها .

الاستقراض من اجبت رسمية والمصارف وبالشروط التي تراها مناسبة سواء مقابل رهن موجودات شركة او بدون ذلك

القيام بكافة الأعمال والإجراءات القانونية التي تراها لازمة او مناسبة لتسهيل تحقيق نشاطها .

بعض - رأس مال الشركة:

رأس مال الشركة ((٦٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ دينار)) فقط .

سبعة مائة مليون دينار مقسم إلى ((٦٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ سهم)) فقط

قيمة السهم الواحد دينار واحد .

- المؤسس -

المؤسس الموقع في التواقيع لرفقة طياً قررت على تأسيس الشركة انمين السهم ورأس مالها أعلاه ، قد خولت المحامي السيد (عبد الحسن الخزرجي) للقيام بعملية تسجيل الشركة لدى دائرة تسجيل شركات ومراجعة أية دائرة أخرى تتطلبها عملية التسجيل .

وكيل المؤسس / القائم بالتسجيل

الاسم: المحامي عبد الحسن الخزرجي

العنوان: بغداد - المشترق محطة ٧٢٩ زقاق ١٧ دار ١٠٨

NO. : GC \
DATE : \ \ 20

العدد : ع ح ١٢٢٢١
التاريخ : ١٩ / ١١ / ٢٠١٣

إلى/ شركة وجه الخير للمقاولات العامة المحدودة

العنوان/ بغداد - مجاور فندق فلسطين مرديان

موبايل ٠٧٧٩٢٢٢٥٦٢-٠٧٧٠٦٠٠٩٠٣٧

E-mail:Wajh alkear @yahoo.com

م/احالة مناقصة رقم (٣) لسنة ٢٠١٣

مشروع(تاهيل وتطوير ابنية الاقسام العلمية والمراكز البحثية والتدريبية القائمة في الجامعة

التكنولوجية/قسم العلوم التطبيقية)

- استناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا وبموجب كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم (ع/٤٦٩٩ في ٢٣/١٠/٢٠١١) وما جاء في محضر لجنة تحليل وتدقيق العطاءات نحيل إليكم تنفيذ فقرات المناقصة(رقم ٣ لسنة ٢٠١٣) المدونة تفصيلها في أدناه راجين حضوركم إلى رئاسة الجامعة/ شعبة العقود الحكومية خلال فترة (١٤ يوم) عشر يوماً من تاريخ تبليغكم بقرار الاحالة لتسديد الرسوم والتأمينات وإكمال إجراءات التعاقد وبخلافه يتم توجية أنذار بضرورة توقيع العقد وبعد أنتهاء المدة القانونية للانداز تعتبرون ناقلين وستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحقكم .

التفاصيل :

١- التوبيخ //

المادة (٥) النوع (٢) تفصيل النوع (٣) التسلسل (٢٥)

٢- اسم المشروع الرئيسي //

مشروع تاهيل وتطوير ابنية الاقسام العلمية والمراكز البحثية والتدريبية القائمة في الجامعة التكنولوجية/
قسم هندسة البناء والانشاءات)

٣- المبلغ مفصلاً //

أ- مبلغ الاحاله (٢٠٢١٠٠٠٠٠٠ دينار) فقط مائتان وأثنان مليون ومائة الف دينار .

ب- المبلغ الإجمالي (٢٢٢٣١٠٠٠٠٠ دينار) فقط مائتان وأثنان وعشرون مليون وثلاثمائة وعشرة الف دينار .

الجامعة التكنولوجية
شعبة
العقود الحكومية
الصادر



شركة العامة للبيطرة

مصرف

الاقتصاد للاستثمار والتمويل (م.خ)

الادارة العامة

١٠٨٦

العدد :

التاريخ : ١٤ / ١١ / ٢٠١١

الى/الشركة العامة للبيطرة

م/ كفاءة مالية

تحية طيبة وبعد ..

نؤيد لكم ان شركة وجه الخير للمقاولات العامة المحدوده لديها حساب جازي برقم (5161) في مصرفنا الاقتصاد للاستثمار والتمويل - فرع الحارثية وتتمتع بكفاءة ماليه جوده علماً ان مصرفنا لا يتحمل اي تبعه ماليه او قانونية من جراء تزويدكم بهذا التأييد شاكرين تعاونكم معنا ولكم وافر الشكر والاحترام.

... مع التقدير

مديرة فرع الحارثية
خالدة قاسم



Head Office : Iraq - Baghdad - Al-Mansour
14th of Ramadan St. - Al-andalus District
Local Phone : (+9641) 5426828 - 5422482
Fax.:5439939
P.O.Box : 55432 Baghdad Central P.O.

E-mail:
economy_bank@yahoo.com

الادارة العامة : العراق - بغداد - المنصور - تقاطع ١٤ رمضان
حي الاندلس - جهة الاسكان م ٦١٧ شارع ١٧ دار ١٨٠
هاتف ٥٤٢٦٨٢٨ - ٥٤٢٢٤٨٢ (+٩٦٤١)
فاكس ٥٤٣٩٩٣٩
م . ب . ٥٥٤٣٢ بغداد المركزي



NO : GC \
DATE : \ \ 20

العدد : ع ح ١٢٤٤ /
التاريخ : ١٩ / ١١ / ٢٠١٢

٤- مدة الانجاز //

(٩٠ يوم) تسعون يوم تبدأ من تاريخ أمر المباشرة.

٥- الغرامات التأخيرية عن كل يوم تأخير //

(٢٢٤٥٥٦ دينار) فقط مائتان واربعه وعشرون الف وخمسمائة وستة وخمسون دينار

٦- فترة الصيانة //

(سنة واحدة) من تاريخ الاستلام الاولي.

تفاصيل الرسوم والتأمينات وأجور الاعلان :-

• تأمينات حسن التنفيذ بمبلغ قدره (١١١٥٥٠٠ دينار) فقط احدى عشر مليون ومائة وخمسة عشر الف وخمسمائة دينار وتمثل نسبة (٥%) من المبلغ الاجمالي (مبلغ الاحالة و ١٠% احتياط) وتكون على شكل خطاب ضمان أو صك مصدق أو كفالة مصرفية ضامنة (من مصرف عراقي معتمد).

• رسم الطابع المالي بمبلغ قدره (٤٠٤٢٠٠ دينار) فقط أربع مائة واربعه الف ومائتا دينار وتمثل نسبة (٠,٠٠٢) اثنان بالالف من مبلغ الاحالة.

• رسم الطابع الهندسي بمبلغ قدره (١٠١٠٥٠ دينار) فقط مائة وواحد الف وخمسون دينار وتمثل نسبة (٠,٠٠٥) نصف بالالف من مبلغ الاحالة.

• رسم الطابع العدلي بمبلغ قدره (٥٠٠ دينار) فقط خمسمائة دينار عراقي لأغير.

• اجور الاعلان والنشر في الصحف المحلية.

أ.د. امين دواي ثامر

رئيس الجامعة التكنولوجية

الجامعة التكنولوجية
شعبته
العقود الحكومية
الصادره
العدد

IRAQ - BAGHDAD

www.uotechnology.edu.iq/goveconts



العراق - بغداد

نسخة منه الى /
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة الاعمار والمشاريع / قسم العقود الحكومية
- وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي / الجهاز المركزي للإحصاء و دائرة التشييد و التخطيط
- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية / دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي
- ديوان الرقابة المالية
- قسم الشؤون المالية
- وحدة المتقدرات / المنبارة المنالسة
- ملف الصادرة

بسم الله الرحمن الرحيم

مصرف الرشيد / الادارة العامة

القسم المحاسبي



العدد / ٤٤٠٠
التاريخ / ١٢ / ١٠ / ٢٠٠٩

الس / شركة وجه الخير للمقاولات


العنوان / بغداد / قرب فندق مرديان / البتاويين / ١٠٢م / ٤٥ / عمارة ٧ / ط ٢

م / موافقة

نود اعلامكم بموافقة مصرف الرشيد / الادارة العامة على احوالة اعمال مدخل الادارة العامة / القسم الدولي بعهدتكم وبمبلغ /- ٥٠٨٠٠٠٠ (فقط خمسة ملايين وثمانون الف دينار لاغيرها) وبمدة عمل (٢٥) يوم وبضمان بالعمل لمدة ستة اشهر وبغرامة تاخيرية بمبلغ /- ٢٠٢٤٠ دينار (فقط عشرون الف دينار لاغيرها) عن كل يوم تاخير .

***** مع التقدير *****

فيس مهدي دله علي
مدير القسم



نسخه منه الى /

- شعبة المحاسبة / ٥٦٠ لاتخاذ مايلزم .
- وحدة المحاسبة / لتاشير ذلك لديكم نرفق لكم طيا " صورته ضوئيه من الموافقة الاصلية .
- وحدة المدني / للعلم والمتابعة .
- الاضبارة العامة .
- الاضبارة الخاصة .

يسرى ٥ / ١٠ / ٢٠٠٩

العدد:- ٢٠١٨/٤
التاريخ:- ٢٠١٦/٢/١٦

وزارة الاعمار والاسكان
شركة الفاروق العامة للمقاولات
الانشائية
الشؤون القانونية

وزارة الاعمار والاسكان
شركة الفاروق العامة للمقاولات الانشائية
قسم الشؤون القانونية

((عقد تنفيذ))

تنفيذ أعمال بناءية السوق - المركز الصحي - غرفة حارس عدد (٢) في مشروع مجمع الشموخ السكني ذي قار/الناصرية
.....

الطرف الاول: مدير عام شركة الفاروق العامة للمقاولات الانشائية اضافة لوظيفته

مثنى عباس حسن

العنوان: بغداد- العلوية- شارع النضال- حي الوحدة م. ١٠٣ ز ٣٠

الطرف الثاني: شركة وجه الخير للمقاولات العامة - السيد عبد الجبار احمد محمد

العنوان: كركوك - طريق بغداد هـ - ٧٩٠٢٥٦٩٢٣٩ - ٧٧٠٢٥٦٩٢٣٩ - ٧٧٠٧٥٠٦٦٤٦٦ - ٧٧٠٧٥٠٦٦٤٦٦ - ٧٩٠١٤٣٩٥١٦

اشارة الى موافقة مجلس الادارة المرقم (١٨) في ٢٧/١/٢٠٠٩ وتقرير لجنة التحليل والدراسة العروض المرقم (بلا) في ٢٢/١/٢٠٠٩ وكتاب الاحالة المرقم (١٢١٦) في ٨/٢/٢٠٠٩ والعرض المقدم من قبل الطرف الثاني المرقم (بلا) في ٢١/١/٢٠٠٩ وبعد اطلاعه على مواقع العمل وحصوله على المعلومات الضرورية والمواصفات الفنية والشروط ونوعية العمل وجودته اتفق الطرفان على ما ياتي:

اولاً:- يقوم الطرف الثاني:- تنفيذ أعمال بناءية السوق - المركز الصحي - غرفة حارس عدد (٢) في مشروع مجمع الشموخ السكني في ذي قار/الناصرية (مواد+عمل) عدا مادة حديد التسليح والكونكريت تجهز من قبل الشركة على أن ينفذ العمل بموجب الشروط وجدول الكميات والمواصفات المطلوبة في المناقصة وتكون جميع المواد خاضعة للفحص المختبري المحدد من قبل الشركة .

ويمبلغ اجمالي قدره (٦٢٢,٨٣٩,٢٥٠) ستمائة واثنان وعشرون مليون وثمانمائة وتسعة وثلاثون الف ومائتان وخمسون دينار فقط لاغيرها

وبمدة صيانة قدرها (سنة واحدة) من تاريخ الاستلام الاولي
وحسب التفاصيل المبينة في جدول الكميات المرفق

ثانياً:- مدة العمل (تسعة اشهر) اعتباراً من تاريخ المباشرة الفعلية الذي يؤيد من قبل ادارة المشروع وفي حالة تأخر التنفيذ يتم تحميله غرامة تأخيرية قدرها (٢٣٠,٦٨٠) مائتان وثلاثون الف وستمائة وثمانون دينار عن كل يوم تأخير في حالة مسؤوليته بشكل مباشر عن التأخير ولا يزيد المبلغ المستقطع عن ١٠% من اجمالي مبلغ العقد وللطرف الاول سحب العمل واكماله على حساب الثاني عند بلوغ الغرامة الحد اعلاه دون الحاجة الى اذار رسمي او قرار قضائي

ثالثاً:- في حالة عدم جودة العمل المنفذ للاعمال المتعاقد عليها بالنوعية المطلوبة فعلى الطرف الثاني بأيعاز من الطرف الاول ازالة العمل المرفوض واعادة تنفيذه مجدداً خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه بذلك وفي حالة عدم قيامه برفع الاعمال المرفوضة واعادة تنفيذها خلال المدة المحددة يقوم الطرف الاول برفعها واعادة تنفيذها على نفقة الطرف الثاني مباشرة دون الحاجة الى صدور قرار حكم او توجيه اذار .

رابعاً:- يكون الطرف الثاني مسؤولاً عن اي اضرار تلحق بمتلكات الطرف الاول او الغير من جراء تنفيذه لاعماله ويكون التعويض عن الاضرار التي تلحق بمتلكات الطرف الاول بالاسعار السائدة دون الحاجة الى حكم قضائي لاستحصاليها. يحق لصاحب العمل ادراج المقاول في القائمة السوداء في حالة تلكوه عن المباشرة في العمل او عدم التزامه او ايفائه بالتزامات التعاقدية

سادساً:- للطرف الاول الحق في سحب العمل من الطرف الثاني وتنفيذه على حسابه مع تحميله كافة الاضرار الناجمة عن ذلك دون اللجوء الى المحكمة او توجيه اذار في حالة رداءة العمل المنفذ من قبل الطرف الثاني مع تحميله المصاريف الادارية بنسبة ٢٠% عشرون بالمئة من كلفة الاعمال المتبقية التي يتم تنفيذها على حسابه.

عبد الجبار احمد محمد
٢٠١٦/٢/١٦

(عقد رقم (٥٨٨) لسنة ٢٠١٠ هـ)

تنفيذ وبناء دار سكن لأدارة صيانة مشاريع ري وبزل ذي قار / في محافظة ذي قار

الطرف الأول :- الهيئة العامة لصيانة مشاريع الري والبزل / المدير العام/ اضافته لوظيفته
الطرف الثاني :- شركة وجه الخير للمقاولات العامة المحدودة / المدير المفوض / عبد الجبار أحمد محمد
العنوان :- بغداد * مجاور فندق ميرديان * م ١٠٢ * ٤٥ مبنى ٧ * ط ٢ موباييل : ٠٧٧٠٢٥٦٩٢٣٩ .

استناداً الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب الامر الوزاري المرقم (٥٠٧١) في ٣١ / ٣ / ٢٠٠٨ وبناءاً على ماجاء في
توصية لجنة دراسة العطاءات المشكّلة بموجب الامر الإداري المرقم (١٣٠٧٦) في ٢٠١٠/٩/١
فقد تم الاتفاق على ابرام هذا العقد بين الطرفين وفق الشروط المدرجة في ادناه :-

وصف العمل

(تنفيذ وبناء دار سكن لأدارة صيانة مشاريع ري وبزل ذي قار / في محافظة ذي قار)
علماً ان العمل مخصص بضمن الخطة الاستثمارية لعام ٢٠١٠ م بناءً على دور سنوية /
قطاع التشييد والسكن والأعمار.

أولاً: يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ العمل المذكور اعلاه بدون اي تحفظات وفقاً لجدول الكميات والشروط الخاصة بالمناقصة
والمواصفات الفنية المعتمدة والخرائط والمرتسمات وشروط المقولة لأعمال الهندسية المدنية بجزئها الأول والثاني وكتاب
الاحاله المرقم (١٣٦٦٣) في ٢١ / ٩ / ٢٠١٠ والتي تعتبر جميعها جزء لا يتجزأ من عقد المقولة .
ثانياً: مبلغ العقد : (١٣٣,٥٢٣,٥٠٠) مائه وثلاثة وثلاثون مليون وخمسمائة وثلاثة وعشرون الف وخمسمائة دينار.

ثالثاً: مدة العمل (٩٠) تسعون يوماً ابتداء من تاريخ توقيع العقد بضمنها ايام الجمع والعطل الرسمية .

رابعاً: مبلغ الغرامه التأخيريه : (١٤٨,٣٦٠) مائة وثمانية واربعون الف وثلثمائة وستون دينار
عن كل يوم تاخير على ان لا يزيد الحد الاعلى عن ١٠% من مبلغ الكلي وقبل بلوغ هذا الحد وبعد بلوغ المدة التأخيرية ٢٥%
خمسة وعشرون من المئة من مدة العقد (مضاف اليها اي مدد اضافية ممنوحة) وللطرف الاول تشكيل لجنة يكون الطرف
الثاني عضو فيها للصرف على الاعمال المتبقية اوسحب العمل منه وتنفيذه على حسابه.

خامساً: يلتزم الطرف الاول بدفع مستحقات الطرف الثاني بموجب الذرعات للاعمال المنجزة استناداً لشروط المناقصة ووفق
جدول الكميات المتفق عليه بين طرفي العقد وبعد تاييد المهندس المشرف على العمل .

سادساً: تكون نسبة التحويلات الاداريه عن قيام صاحب العمل او بواسطته بتنفيذ اي من التزامات المقاول في حاله اخلاله بموجب
المقوله ٢٠% من الكلفه الفعلية لتنفيذ ذلك الالتزام دون الانتقاص من مسؤوليه الطرف الثاني بموجب المقوله.

سابعاً: على الطرف الثاني مراجعه الجهاز المركزي للاحصاء او فروعه لتزويده بالمعلومات الاحصائية او تقديمه ما يؤيد
مراجعتهم ومراجعه الهيئة العامه للضرائب او فروعه لتقديم ما يؤيد براءة ذمته بالنسبه للشركات الحكوميه فقط وكذلك مراجعه
شركه التأمين الوطني للتأمين على المقوله وتقديم المستمسكات المطلوبه لذلك ستقوم هذه الهيئة بالتأمين المطلوب وتمديد اقساط
التأمين واستقطاعها من مستحقات الطرف الثاني وكذلك مراجعه وزارة العمل والشؤون الاجتماعيه/ دائرة التقاعد والضمان
الاجتماعي لتقديم براءة الذمه المطلوبه منه وكذلك مراجعه وزارة الاتصالات لتقديم براءة الذمه المطلوبه منه.

ثامناً: ان العقد خاضع للضريبة ولايجوز الاعفاء منها الأبموافقة الهيئة العامة للضرائب وتعليمات العقود النافذة .

تاسعاً: تستقطع نسبه ١٠% من كل دفعة تستحق للطرف الثاني عن الاعمال المنجزة وتبقى المبالغ المستقطعه كأمانات لدى الطرف
الاول وتستمر الاستقطاعات الى ان يصل مجموعها ٥٠% من مبلغ العقد واستناداً للمادة (٦٢) / ١ / ١ من شروط المقولة
للاعمال الهندسة المدنية .

التوقيع
التاريخ

التوقيع
التاريخ



كومارح عيزاق

پاريز گايح كركوك
بش شح كاروبارح ياسايح
هوبلح پروژهكان

" لنجعل من الاهداف الإنمائية لسنة ٢٠٢٢ نمونيا لدوي الإعاقه في المجتمع "

العدد/

١٢٢٠٠

التاريخ ٢٠١٣/١٢/١٤

الى / شركة (وجه الخير للمقاولات) / العنوان (كركوك / عمارة الجدوع)
هاتف (٠٧٧١٨٥٨٠٤٢٦)

الموضوع / إحالة مناقصة

شاء على مصادقة لجنة المراجعة والمصادقة وموافقة رئيس جهة التعاقد تقرر احالة مشروع (بناء مخزن جملوني في الحويجة - الديس - دافوق) على شركتكم واستناداً على ماورد بكتاب لجنة تدقيق الاحالات المرقم (١٢٩٤٩) في ٢٠١٣/١٠/٢١ ومرفقه حضر تحليل وتدقيق العطاء موضوع بحث اعلاننا المرقم (١٠٩٥٣) في ٢٠١٣/٩/٥ بعهدتكم بمبلغ قدره (٥٨٠,٧٢٢,٥٠٠) ديناراً وكتابة (خمسمائة وثمانون مليون وسبعمائة واثنان وثلاثون الف وخمسمائة دينار) حسب الخطي المقدم الى لجان فتح وتحليل العطاءات وبمدة تنفيذ العمل (٩٠ يوماً) كتابة (تسعون) يوماً اعتباراً من تاريخ بسرة بالعمل عليه اقتضى حضوركم الى محافظة كركوك / قسم الشؤون القانونية لغرض تنظيم العقد مستصحين معكم صديقه حسب الأصول وبعد مرور (٧) (سبعة) ايام من تاريخ تبليغكم بكتابنا هذا والمرسل اليكم بنسختين للتوقيع على النسخة ولئى منه واعادته الينا باعتبار كتاب الاحالة هذا جزءاً من المستمسكات القانونية في حال عدم حصول شكوى صيل المبالغ المطلوبة للمشروع:-

١- التأمينات النظامية (٢٢٥,٠٣٦,٠٣٦) تسعة وعشرون مليون وستة وثلاثون الف وستمائة وخمسة وعشرون ديناراً على ان م يشكل صك مصدق او خطاب ضمان.
٢- الرسم الهندسي (٥٨٠,٧٥٠) خمسمائة وثمانون الف وسبعمائة وخمسون ديناراً.
٣- رسم تصديق العقد (١,١٦١,٥٠٠) مليون ومائة وواحد وستون الف وخمسمائة ديناراً.

الدكتور

نجم الدين عمر كريم
محافظ كركوك

٢٠١٣/ /

بمنه الى /

- ١- مجلس محافظة كركوك / للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- ٢- التخطيط والمتابعة / للعلم مع التقدير.
- ٣- العامة للضرائب كركوك / لاتخاذ مايلزم مع التقدير.
- ٤- التأمين الوطنية / فرع كركوك / لاتخاذ مايلزم مع التقدير.
- ٥- العمد والضمان الاجتماعي / لاتخاذ مايلزم مع التقدير.
- ٦- حسابات المحافظة / لاتخاذ مايلزم مع التقدير.
- ٧- هندسة / لاتخاذ مايلزم مع التقدير.
- ٨- تدقيق / للعلم مع التقدير.
- ٩- تربية كركوك / لاتخاذ مايلزم مع التقدير.
- ١٠- التخطيط والمتابعة / قسم العقود / للعلم مع التقدير.
- ١١- الخاصة



للمداول

بسم الله الرحمن الرحيم



جمهورية العراق
رئاسة ديوان الوقف السني
دائرة الشؤون الهندسية

العدد ١٠٩٤
القسم
التاريخ الهجري / /
التاريخ الميلادي ٢٠١٠ / ٨ / ٢٠

المشاريع

شركة وجه الخير للمقاولات العامة
بغداد / البتاوين / م / ١٠٢ / شارع ٤٥ عمارة ٧
موبايل / ٠٧٧٠٧٥٠٦٦٤٦ / ٠٧٧٠٢٥٦٩٢٣٩ / م / انهاءات كلية البنات / جامعة الامام الاعظم

حصلت الموافقة على تصديق احالة العمل اعلاه بعهدتكم بسعر عطاءكم البالغ ١٢١٢٩٧٣٥٠٠ مليار ومئتا
واثنا عشر مليون وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة دينار وخمسة عشر ألف دينار وبمدة تنفيذ ١٥٠
مئة وخمسون يوما راجين مراجعة قسم العقود وشركة التامين الوطنية لغرض اجراء التعاقد

المرفقات
١ / كشف

لؤي كمال جواد
المدير العام لدائرة الشؤون الهندسية
٢٠١٠ / ٨ / ٢٠

نسخة منه الى

مكتب السيد معاون رئيس الديوان للشؤون الدينية / موافقتكم بتاريخ ٢٠١٠ / ٢ / ٢٠ لتفضل بالاطلاع مع
التقدير

مكتب السيد المفتش العام / مكتب الهندسية لتفضل بالاطلاع مع التقدير .

مكتب السيد المدير العام

مكتب السيد معاون المدير العام / لتفضل بالاطلاع مع التقدير .

وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي / دائرة التشييد والخدمات والإسكان

الهيئة العامة للضرائب

مدير قسم المشاريع

قسم المشاريع

قسم العقود / مع الأوليات والعطاءات كافة لأجراء التعاقد مع الشركة اعلاه

قسم التخطيط والمتابعة / مع نسخة من الكشف

حسابات الخطة / حصلت موافقة معاون رئيس الديوان للشؤون الدينية بتاريخ ٢٠١٠ / ٢ / ٢٠

الجهل المركزي للإحصاء

مديرية إحصاء بغداد

مديرية ضمان بغداد

شركة التامين الوطنية

لنظمة ٢٠١٠ / ٢ / ٧

٧ - عطاء المقاول أو أي كتاب أو وثيقة بتعديل الأسعار والشروط أو الكميات يتم الاتفاق بين الطرفين بعد تقديم العطاء وتكون مصادقه من قبل الطرفين.
٨ - أي تحفظ أو شرط خاص للمقاول وارد في عطاءه وغير وارد في نصوص هذا العقد يعتبر لاغياً
خامساً : ١ - في حالة ظهور زيادة بالكميات فيتم تسعيرها وفق مايلي : -
أ- إذا كانت الزيادة ضمن الـ ٢٠٪ من الكميات التعاقدية فيتم تسعيرها بنفس اسعار جدول الكميات والاسعار التعاقدية

ب- الكميات التي تزيد عن الـ ٢٠٪ يتم الاتفاق على اسعارها بين الطرفين
٢ - لا يحق للمقاول التلذذ بالعمل أو إيقافه عند تأخر البت بتسعير الفقرات التي زادت كمياتها عن الـ ٢٠٪ أو الفقرات المستحدثة.
٣ - لا يحق للمقاول المطالبة بالأرباح المتوقعة إذا نقصت الكميات التعاقدية وبأي نسبة كانت أو إذا تم إلغاء بعض الفقرات لضرورة العمل.

سادساً : يلتزم الطرف الثاني بتهيئة مستلزمات العمل من عمال ومعدات ومواد بموجب العقد ويتحمل التبعات الناشئة من عماله ويكون مسؤولاً عنهم من كافة النواحي ومن الحوادث والوفيات أيضاً

سابعاً : في حالة عدم التزام الطرف الثاني بتنفيذ العمل ومخالفته لبنود العقد وتلكوه في تنفيذه بالشكل الذي يؤدي الى تأخر انجازه أو سوء تنفيذه يحق للطرف الاول سحب العمل منه بعد اذاره نهائياً وينفذ على حسابه استناداً لأحكام المادة (٦٥) الخامسة والستون من الشروط العامة دون الحاجة للجوء إلى المحاكم المختصة على أن يتم تثبيت واقع الحال من قبل لجنة يقوم بتشكيلها الطرف الاول ويمثل فيها الطرف الثاني بعد اشعاره بكتاب رسمي وفي حالة عدم حضوره أو من يمثله رسمياً وخلال مدة اسبوع من تاريخ تبليغه فتقوم اللجنة بتثبيت واقع الحال ويكون قرارها ملزم وواجب التنفيذ من قبل الطرف الثاني

ثامناً : يقوم الطرف الثاني بتقديم برنامج زمني تفصيلي لتنفيذ العمل المتعاقد عليه خلال فترة لا تتجاوز (٥٪) من مدة العقد محسوبة من تاريخ كتاب الاحالة ويصادق من الطرف الاول اعتماده في تنفيذ التزامات الطرف الثاني .

تاسعاً : يتم استحصا المبالغ المترتبة بذمة الطرف الثاني في حالة تحقيقها بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية النافذ أو أي قانون آخر يحل محله .

عاشراً : يلتزم الطرف الثاني بالمطالبة بأصدار اوامر الغيار بالكميات في حالة الزيادة والنقصان في مدة أقصاها (١٥) يوماً بعد انجازه الفقرة وبعبكسه يسقط حقه بالمطالبة .

احدى عشر : يلتزم الطرف الثاني بتقديم طلب تمديد المدة للفقرات والاعمال التي تحصل فيها التوقيات خلال مدة لا تتجاوز (١٥) يوماً من تاريخ التوقف وبعبكسه يهمل اي طلب للتمديد يقدم بعد الفترة المحددة آنفاً .

اثنا عشر : يتعهد الطرف الثاني عدم التعاقد مع المقاولين الثانويين الا بعد موافقة الطرف الأول تحريراً ويكون الطرف الثاني مسؤولاً مسؤولة كاملة من الناحيتين الفنية والقانونية عن أعماله أمام الطرف الأول ويكون ملزماً بتسمية مهندس ذو اختصاص لمتابعة اعماله وتنفيذ العقد خلال فترة لا تتجاوز (٥٪) من مدة العقد ويخصم مبلغ لا يتجاوز نسبة (٥٪) من مبلغ العقد في حالة عدم تواجد المهندس في المشروع .

ثلاثة عشر : في حالة حصول تعارض بين الشروط الخاصة والشروط العامة الواردة في مستندات العقد يتم الاعتماد على الشروط الخاصة في تنفيذ بنوده ويعتبر التعارض الذي يرد في الشروط العامة لاغياً

اربعة عشر : يلتزم الطرف الثاني بفترة صيانة امدها (سنة واحدة) عن الاعمال المنفذة من قبله تبدأ

عبد الجبار احمد
شرفه ومهنا



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

العدد: ٩٢٩ / ٤٣
التاريخ: ١٩ / ١٠ / ٢٠٠٩ م
الموافق: ١٤٣٠ / / هـ



جمهورية العراق
وزارة النفط
شركة خطوط الأنابيب النفطية
(شركة عامة)

(سري)

الى / شركة وجه الخير للمقاولات العامة
المدير المفوض / عبد الجبار احمد محمد

رقم الهاتف / ٠٧٧٠٢٥٦٩٢٣٩

م/ احالة المناقصة المرقمة (٢٤/٢٠٠٩)
الخاصة بـ (انشاء بناية مختبر في مستودع المشاهدة)

نود اعلامكم بأحالة المناقصة المرقمة أنفاً بعهديتكم وبسعر عطاءكم البالغ (٦٣٨٨٩٠٠٠) فقط
ثلاثة وستون مليوناً وثمانمائة وتسعة وثمانون الف لاغير وبمدة تنفيذ امدها (١٥٠) يوم اعتباراً
من تاريخ المباشرة بالعمل .
عليه يرجى حضوركم الى مقر الشركة في الدورة / القسم القانوني خلال ثلاثة ايام من استلامكم
كتابنا هذا لغرض توقيع العقد مستصحبين معكم التأمينات النظامية البالغ (١٩٤٤٥٠) فقط فقط
ملايين ومائة واربعه وتسعون الف واربعمائة وخمسون دينار لاغير مع رسم الطابع
الباق (١٢٢٢٧٨) فقط مائة وسبعة وعشرون الف وتسعمائة وثمانية وستون دينار لاغير يضاف
مبلغ (٩٥٠) دينار فقط تسعمائة وخمسون دينار لاغير عن الرسوم العدلية والنسخ الاضافية .
مع التقدير

هاشم عبد الغفور شاكر
المدير العام وكالة
رئيس مجلس الادارة
صلاح حسن علي
ع/ المدير العام

صورة منه الى/

- البيئية العامة للضرائب / قسم الشركات
- القسم المالي / شعبة العقود / للتفضل بالعلم . راجين اتخاذ مايلزم من قبلكم مع التقدير .
- قسم الهندسة المدنية / للتفضل بالعلم . مع التقدير
- قسم الدراسات والتخطيط والمتابعة / للتفضل بالعلم . مع التقدير .
- القسم القانوني / شعبة العقود / مع كافة الاوليات لتنظيم العقد .
- الاضبارة .

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة


شهادة تأسيس شركة

الر ترارنا المرقم م٢٠٠٠٧٠٧٢٢، والمؤرخ في ٢٠٠٧/٧/٢٢، ٢٠٠٧/٧/٢٩، ١٤٢٩/٠٧/١٩، نصدر هذه الشهادة لأبناء
وجه الخبير للمقاولات العامة محدودة المسنونة لشركة خاصة
رأس مالها ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ تنافس مدينة رينار

تتصلحيتي مسجل للشركات، اريد بتأريخ المتكور اعلان تسجيل الشركة المتكورة افنا خيتا لأحكام قانون الشركات .
لأنة ١٩٩٧، المسجل، وران للشركة المتكورة تعتبر مؤسسة اجتبارا من اليوم.

في تاريخ اليوم ١٩ من شهر رجب لسنة ١٤٢٩ هـ، المصالح اليوم ٢٢ من شهر نوم
عنان بن عيسى

ختماء المتكور
مسجل الشركات



توايسته سلمه

عنان بن عيسى

مدير شركة
مؤسس شركة
مؤسس شركة
مؤسس شركة



توايسته سلمه

مدير شركة
مؤسس شركة
مؤسس شركة
مؤسس شركة



للمعاول

بسم الله الرحمن الرحيم



جمهورية العراق
رئاسة ديوان الوقف السني
دائرة الشؤون الهندسية

العدد ١٠٩٤
القسم
التاريخ الهجري
التاريخ الميلادي

١٤٢ / /
٢٠١٠ / ٢ / ٨

المشاريع

شركة وجه الخير للمقاولات العامة
بغداد / البتاوين / م / ١٠٢ / شارع ٤٥ عمارة ٧
موبايل / ٠٧٧٠٧٥٠٦٦٤٦ / ٠٧٧٠٢٥٦٩٢٣٩ / م / انهاءات كلية البنات / جامعة الامام الاعظم

حصلت الموافقة على تصديق احالة العمل اعلاه بعهدتكم بسعر عطاءكم البالغ ١٢١٢٩٧٣٥٠٠ مليار ومئتا
واثنا عشر مليون وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة دينار وخمسة عشر ألف دينار وبمدة تنفيذ ١٥٠
مئة وخمسون يوما راجين مراجعة قسم العقود وشركة التامين الوطنية لغرض اجراء التعاقد

المرفقات
١ / كشف

لؤي كمال جواد
المدير العام لدائرة الشؤون الهندسية
٢٠١٠ / ٢ / ٨

نسخة منه الى

مكتب السيد معاون رئيس الديوان للشؤون الدينية / موافقتكم بتاريخ ٢٠١٠ / ٢ / ٢ لتفضل بالاطلاع مع
التقدير

مكتب السيد المفتش العام / مكتب الهندسية لتفضل بالاطلاع مع التقدير .

مكتب السيد المدير العام

مكتب السيد معاون المدير العام / لتفضل بالاطلاع مع التقدير .

وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي / دائرة التشييد والخدمات والإسكان

الهيئة العامة للضرائب

مدير قسم المشاريع

قسم المشاريع

قسم العقود / مع الأوليات والعطاءات كافة لأجراء التعاقد مع الشركة اعلاه

قسم التخطيط والمتابعة / مع نسخة من الكشف

حسابات الخطة / حصلت موافقة معاون رئيس الديوان للشؤون الدينية بتاريخ ٢٠١٠ / ٢ / ٢

الجهل المركزي للإحصاء

مديرية إحصاء بغداد

مديرية ضمان بغداد

شركة التامين الوطنية

لنظمة ٢٠١٠ / ٢ / ٧

جمهورية العراق
Ministry of Agriculture
The Directorate General of Livestock
Resources Services
Contracts Department



وزارة الزراعة
دائرة الثروة الحيوانية
شعبة العقود العامة

العدد : ٥٩٥٧
التاريخ : ٢٠١٣/٥/٢٣

إلى / شركة وجه الخير للمقاولات العامة المحدودة
العنوان / بغداد / السعدون / مجاور فندق ميرديان محلة / ١٠٢ / ز / ٤٥ عمارة / ٧ شقة / ٥
م / احالة مناقصة

مناقصة رقم (٢) لسنة ٢٠١٣ (تنفيذ استكمال منظومة تصفية لمشروع دواجن الأجداد في سامراء)
استناداً إلى توصية لجنة التحليل والإحالة المشكلة بالأمر الإداري المرقم ٥٦٣ في ٢٠١٣/١/٢١ ومصادقة لجنة المصادقة
على محضر الإحالة المشكلة بموجب الأمر الإداري المرقم ٤٦٦ في ٢٠١٣/٥/٧ وكتاب الوزارة قسم العقود العامة المرقم
١٨٤٦٠ في ٢٠١٣/٥/٢٣ .

تقرر احالة تنفيذ اعمال المناقصة رقم ٢ لسنة ٢٠١٣ المشار إليها أعلاه بعهدة شركتكم وبمبلغ عطاءكم البالغ (٤٣٩٧٦٠٠٠٠) أربعمائة وتسعة وثلاثون مليون وسبعمائة وستون ألف دينار عراقي لأغبرها وبمدة تنفيذ (٥) خمسة أشهر من تاريخ المباشرة بالعمل على إن تنفيذ المقاوله أعلاه وفقاً للشروط والمواصفات الفنية أعلاه وجدول الكميات المعدة من قبل القسم الهندسي في شركتنا ووفقاً لشروط المقاولات لاعمال الهندسة المدنية والكهربائية وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (١) لسنة ٢٠٠٨ وإية تعليمات نافذة بهذا الخصوص راجين حضوركم الى شعبة العقود العامة في مقر الشركة مستصحبين معكم التأمينات القانونية (حسن تنفيذ) البالغة (٥%) من مبلغ عطاءكم بموجب صك مصدق او خطاب ضمان صادر من احد المصارف في بغداد خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تبليغكم بقرار الاحالة الذي يعتبر جزء من العقد وبخلافه سوف يتم تنفيذ العمل على حسابكم وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة.

مع التقدير .

د. مصدق دلفي علي
المدير العام

٢٠١٣/٧/٢٣



صورة عنه الى :-

- وزارة الزراعة / قسم العقود العامة / كتابكم اعلاه للفضل بالعلم ... مع التقدير .
- مكتب المدير العام / للفضل بالاطلاع .. مع التقدير .
- لجنة تحليل وإحالة العطاءات .
- قسم التخطيط والمتابعة / للعلم ... مع التقدير .
- القسم الهندسي / للعلم .. مع التقدير .
- شعبة العقود العامة / المناقصة رقم (٢) لسنة ٢٠١٣ / مع الاوليات .
- الملف العامة .



أكثر الدول تقدماً.. أكثرها ترشيحاً للكهرباء

العدد :
التاريخ : ٢٠١٣/ /

إلى / شركة وجة الخير للمقاولات العامة المحدودة

م/أحاله

إشارة الى العرض المقدم من قبلكم

تحيل اليكم أعمال تأهيل المساحات وبمبلغ إجمالي قدرة (٧٢٧١٠٠٠٠) أثنان وسبعون مليون وسبعمئة وعشرة آلاف دينار فقط وبمدة تنفيذ (٧٥) يوم علماً ان الاحالة خاضعة للأستقطاع الضريبي البالغ ٣% ورسم الطابع ٠,٠٠٢ ورسم الطابع العدلي ٠,٠٠١ ورسم الطابع الهندسي نصف من الالف وتفرض غرامات تأخيرية بموجب المعادلة مبلغ العقد / المدة x ١٠% على ان لا تتجاوز الحد الاعلى نسبة ال ١٠% من قيمة العقد وتقديم صك بالتأمينات الاولية بنسبة ٥% من قيمة الاحالة يرجى ارسال محولكم لتوقيع العقد خلال مدة اقصاها (١٤) يوم من تاريخ استلامكم كتاب الاحالة .
مع التقدير ...

محمد أكرم عاكف -
المدير العام / وكالة
٢٠١٣/٧/ ٢٩

نسخة منه الى :-

- قسم القانونية /الاتحاد اللازم لتنظيم العقد / لطفاً .
- قسم الرقابة الداخلية / لطفاً .
- قسم المشاريع / لطفاً .
- قسم التخطيط / لطفاً .
- قسم المالية / شعبة التجارية / مع الاوليات .
- اشارة الكتب الصادرة .

رجاء ٧/٢٤ احالة شركة وجة الخير للمقاولات العامة

E-mail:70_planning.dept.mgr@moele.gov.iq

البريد الالكتروني لدائرة التدريب والتطوير

بسم الله الرحمن الرحيم

مصرف الرشيد / الادارة العامة
القسم الهندسي



العدد /
التاريخ /
١٤٢٢ / ١٢ / ١٤


الس / شركة وجه الخير للمقاولات
العنوان : بغداد / قرب فندق ميرديان
الموبايل / ٠٧٧٠٢٥٦٩٢٣٩ - ٠٧٧٠٧٥٠٦٦٤٦

م / احالة

نود اعلامكم بموافقة مصرف الرشيد/ شركة عامه على احالة أعمال ترميمات فرع البوشجاع بعهدتكم بمبلغ /- ٢٢٣٥٠٠٠٠٠ دينار (فقط اثنان و عشرون مليون وثلاثمائة وخمسون الف دينار لاغيرها) وبمدة عمل ٤٠ يوم .
يرجى مراجعتنا خلال مدة (٧) أيام لغرض توقيع العقود ودفع الرسوم والتأمينات القانونية .

***** مع التقدير *****

قيس مهدي دله علي
مدير القسم



نسخه منه الى /

- وزارة التخطيط والتعاون الانماني / الجهاز المركزي للاحصاء / للعلم .
- مصرف الرشيد / فرع البوشجاع/ للمتابعة
- شعبة المحاسبة / ٥٦٠ للعلم .
- وحدة المحاسبة / لتاشير ذلك لديكم .
- الشعبة الهندسيه / للعلم .
- الاضبارة العامه .
- الاضبارة الخاصه .

((يسرى ٢٠٠٩/٢/٢))



جمهورية العراق
وزارة التجارة
دائرة تسجيل الشركات

العدد :
التاريخ : ارمضان ١٤٣١
٢٠١٠/٨

(ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقرب)

قرار تعديل عقد شركة محدودة

قدمت اليها شركة وجه لخير للمقاربات انعامه المحدودة المسؤولية قرار الهيئة العامة
تاريخ في ٢٠١٠/٨/٢٠ والمتضمن تعديل المادة الرابعة بزيادة رأسمالها من (٦٠٠٠٠٠٠٠٠) ستمائة
مليون دينار اى (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مليار دينار وذلك باصدار اسهم جديدة مة دارها (٤٠٠٠٠٠٠٠٠)
اربعة اذة مليون . هم ليصبح منظورها كالاتى :-

المادة الرابعة :-

رأسمال الشركة (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مليار دينار مقسم الى (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مليون سهم قيمة السهم الواحد
بواقع واحد .

في مسجل الشركات المنبقت على القرار اعلاه على ان ينشر طبقا لاحكام المادة (٢٠١) من قانون
الشركات رقم ٢ لسنة ١٩٩٧ المعدل .

كتبه ببغداد في يوم التاسع عشر من شهر رمضان لسنة ١٤٣١ هـ
امه بق للـ التمس والعتيرين من شهر آب لسنة ٢٠١٠ مـ

انعام اسكندر
مسجل الشركات
٢٠١٠/٨/



بسم الله الرحمن الرحيم

REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of Reconstruction & Housing
Al-Mansour S. C. C. Co.



جمهورية العراق
وزارة الاعمار والاسكان
شركة المنصور العامة للمقاولات الإنشائية
قسم القانونية

No.:
Date:

الرقم: ٥٩٥٦

التاريخ: ٢٠١٠/٦/١٦

إلى / شركة وجه الخير للمقاولات العامة المحدودة / المدير المفوض عبد الجبار احمد محمد
العنوان / بغداد - الكرادة
الموبايل / ٠٧٧٠٢٥٦٩٢٣٩ - ٠٧٩٠١٨٦٠٢١٧
E-mail: Wajh alkear@yahoo.com

م/احالة

استناداً الى قرار مجلس الادارة في جلسته الاستثنائية (الخاصة) في ٢٠١٠/٦/٧ وقرار لجنة التعهدات المركزية المرقم ١٨ في ٢٠١٠/٥/٣١ تقرر احالة مناقصة تجهيز ونصب خزانات الوقود والزيوت والماء الصافي والحريق لمشروع الاكتفاء الذاتي موقع الكسك ببيوتكم وبمبلغ مقداره (٧٨٧٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار سبعمائة وسبعة وثمانون مليون دينار شاملا كل ما يتطلبه تنفيذ العمل واكتماله وفقاً للشروط والمواصفات الفنية والمخططات وجدول الكميات وبمدة تنفيذ امدها (٩٠) يوم وبغرامة تأخيريه مقدارها (٨٧٤٠٠٠٠٠٠) دينار ثمانمائة واربعه وسبعون الف واربعمائه وخمسه واربعون دينار عن كل يوم تأخير والتعاقب ١% من مبلغ العقد او بلوغ المدة التأخيريه نسبة ٢٥% من (مدة العقد مضاف اليها اي مديد اضافيه ممنوحه) ويستحب العمل وينفذ على حسابكم وفق القانون وتحملكم فرق البدلين . لذا نرجو مراجعتكم مقر الشركة قسم البيوزن القانونيه مستحسبين معكم الآتي :-
- تأمينات حسن التنفيذ مبلغ (٣٩٠٣٥٠٠٠٠٠) دينار بموجب هيك مصدق او خطاب ضمان يشمل مدة التنفيذ + فترة الصيانة.

- رسم طابع مالي مبلغ (١٠٥٧٤٠٠٠٠) دينار
- رسم طابع هندسي مبلغ قدره (٣٩٣٠٥٠٠) دينار
- رسم رسو مناقصة مبلغ (١٠٠٠) دينار
- اجور نشر الإعلان (٢٦٢٠٥٠٠) دينار

لاكمال اجراءات التعاقد وتوقيع العقد وخلال (١٤) يوم من تاريخ كتاب الاحاله هذا وبخلافه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونيه وفقاً للفقرة (ج) من البند (عشرون) من المادة (٧) من تعليمات تنفيذ العقود الحكوميه رقم (١) لسنة ٢٠٠٨ .
.... مع التقدير

وزارة الاعمار والاسكان
شركة المنصور العامة للمقاولات الإنشائية
المدير المفوض
عبد الجبار احمد محمد

بغداد - ساحة المتحف - موقع الشركة على الأنترنت
www.almansourco.com

مكتب بريد بغداد / صندوق بريد / 55037 بدالة / 5373847

٢٠١٠/٦/١٥

تجاري

فروع الشركة : بابل - كركوك - الموصل

REPUBLIC OF IRAQ
MINISTRY OF OIL
MIDLAND OIL COMPANY
(State Company)



جمهورية العراق
وزارة النفط
شركة نفط الوسط
(شركة عامه)

REF:
DATE:

العدد: ٢٨٨٥/٥٨١/١٥
التاريخ: ٢٠١١/٢/١٤

إلى / شركة وجه الخير للمقاولات العامة المحدودة

م / تبليغ بالاحالة

نود اعلامكم باحالة المناقصة العرقمة ن و ٢٠١١/٢٢/ انشاء سقيفة جملون مع غرف
ادارية لشعبة استصلاح الابار وبمبلغ (٤٠٧,٢٣٥,٠٠٠) اربعمائة وسبعة مليون ومائتان
 وخمسة وثلاثون الف دينار عراقي على شركتكم راجين مراجعة القسم القانوني في شركتنا
 وخالل اربعة عشر يوم من تاريخ تبليغكم بكتاب الاحالة لغرض توقيع العقد .

... مع التقدير

دلمان نجم عبد الله
المدير العام (وكالة)

Fax (V.SAT): 3510

TEL: 00964 07270000075

Website: www.mdoc.oil.gov.iq

E-Mail: mdoc.dg@mdoc.oil.gov.iq

رقم الفاكس (V.SAT) : ٣٥١٠

رقم الهاتف : ٠٠٩٦٤ ٠٧٢٧٠٠٠٠٠٧٥

الموقع الالكتروني : www.mdoc.oil.gov.iq

البريد الالكتروني : mdoc.dg@mdoc.oil.gov.iq

REPUBLIC OF IRAQ

IRAQI INTERNATIONAL ECONOMY
CENTER

جمهورية العراق

مركز الأقتصاد العراقي الدولي



لرجال الاعمال



رقم التسجيل : ID 70344



(شهادة تقديرية)

تقرر منح الاستاذ (**عبد الجبار احمد محمد**) شهادة تقديرية

تثميناً لجهوده المتميزة متمنين له كل النجاح في عمله خدمة لعراقنا الحبيب



رئيس المركز
علي نعمه الحلفي

علي نعمه الحلفي



المسائل

بسم الله الرحمن الرحيم



جمهورية العراق
رئاسة ديوان الوقف السني
دائرة الشؤون الهندسية

العدد ١٠٩٢
القسم

التاريخ الهجري ١١٢ / /
التاريخ الميلادي ٢٠١٠ / ٨ / ٨

المشاريع

شركة وجه الخير للمقاولات العامة
بغداد / البتاوين / م / ١٠٢ / شارع ٤٥ عمارة ٧
موبايل / ٠٧٧٠٧٥٠٦٦٤٦ / ٠٧٧٠٢٥٦٩٢٣٩ /
م / انتهاءات كلية البنات / جامعة الامام الاعظم

حصلت الموافقة على تصديق أحالة العمل اعلاه بعهديتكم بسعر عطاءكم البالغ ١٢١٢٩٧٣٥٠٠ مليار ومئتا
واثنا عشر مليون وتسعمائة وثلاثة وسبعون الف وخمسمائة دينار وخمسة عشر الف دينار ومدة تنفيذ ١٥٠
مئة وخمسون يوما راجين مراجعة قسم العقود وشركة التأمين الوطنية لغرض اجراء التعاقد

المرفقات
١ / كشف

لؤي كمال جواد
المدير العام لدائرة الشؤون الهندسية

نسخة منه الى

مكتب السيد معاون رئيس الديوان للشؤون الدينية / موافقتكم بتاريخ ٢٠١٠ / ٢ / ٢ للتفضل بالاطلاع مع
التقدير

مكتب السيد المفضل العام / مكتب الهندسية للتفضل بالاطلاع مع التقدير .

مكتب السيد المدير العام
مكتب السيد معاون المدير العام } للتفضل بالاطلاع مع التقدير .

وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي / دائرة التشييد والخدمات والإسكان

الهيئة العامة للضرائب

مدير قسم المشاريع

قسم المشاريع

قسم العقود / مع الأوليات والعطاءات كافة لأجراء التعاقد مع الشركة اعلاه

قسم التخطيط والمتابعة / مع نسخة من الكشف

حسابات الخبطة / حصلت موافقة معاون رئيس الديوان للشؤون الدينية بتاريخ ٢٠١٠ / ٢ / ٢

الجهز المركزي للإحصاء

مديرية إحصاء بغداد

مديرية ضمان بغداد

شركة التأمين الوطنية

لأطمة ٢٠١٠ / ٢ / ٧

بسم الله الرحمن الرحيم

REPUBLIC OF IRAQ
MINISTRY OF OIL
NORTH GAS COMPANY (NGC)



وزارة النفط
MINISTRY OF OIL
شركة غاز الشمال (شركة عامة)

REF
DATE: / /


العدد: 2/281/7
التاريخ: 2009/09/19

إلى/شركة وجه الخير للمقاولات العامة المحدودة
المدير المفوض/عبد الجبار احمد محمد
العنوان: كركوك - التاميم - الماس - موبايل: 07708900905
E-MAIL: Alsami_20092001@yahoo.com

م / احالة

- أشارة إلى العطاء المقدم من قبلكم على الطليبة المرقمة 2009/882 والخاصة بتاجاز اعمال مقاوله ترميمات مجموعة الصحيات للدور المرقمة 7/1 و 3/2 و 4/2 و 2/1 وترميمات ارضية الدور المرقمة 3/1 و 4/4 داخل المجمع السكني لشركة غاز الشمال وبموجب المواصفات الفنية المطلوبة والمذكورة في اصل الطلب وجداول الكميات المرفقة وتحسب اشرف المهندس المشرف. لذا تمت الاحالة إليكم بمبلغ قدره (17950000) سبعة عشر مليون وتسعمائة وخمسون الف دينار لا غير.
- يرجى التفضل بالحضور إلى مقر الشركة الكائن على طريق كركوك - ببجي خلال ثلاثة أيام من تاريخ الاحالة لغرض تكملة النواقص اذناذ قبل توقيع العقد ...
- 1- جلب صك مصدق أو خطاب ضمان بمبلغ (897500) ثمانمائة وسبعة وتسعون الف وخمسمائة دينار والذي يمثل نسبة 5% من قيمة العطاء المقدم .
 - 2- تقديم براءة ذمة مجددة من الهيئة العامة للضرائب .
 - 3- تقديم اعمال مماثلة (عمل لدوائر او شركات مصدقة من قبلها) .
 - 4- تقديم هوية بلاستيكية تخصصية مجددة .

هنر نجيب حسن
المدير العام
رئيس مجلس الإدارة



صورة منه :-
وزارة النفط/ مكتب السيد المفتش العام
مجلس محافظة كركوك
محافظة كركوك/ مكتب السيد معاون للشؤون الأمنية /- عرفان كركوكلي. راجين مصادقتكم على قرار الاحالة . مع التقدير
المخازن والمشتريات/ مع الأواني
القسم القانوني
قسم التدقيق
قسم الخدمات والعلاقات
المراسلات المركزية

P. BOX (16) KIRKUK
E-MAIL: gas@ngc.gov.iq

صندوق البريد (16) كركوك
www.gas.gov.iq

BAIJI-KIRKUK ROAD

ثالثاً: مدة الانجاز
أن مدة الانجاز هي (١٥٠) منه وخمسون يوماً تبدأ اعتباراً من تاريخ استلام الموقع .

رابعاً: مبلغ العقد
أن مبلغ العقد الكلي هو (١٨١٩٤٧٥٠٠) منه وواحد وثمانون مليون وتسعمائة وسبعة واربعين الف وخمسمائة دينار عراقي .

خامساً: الغرامات التأخيرية

- ١- تفرض غرامة تأخيرية على الطرف الثاني في حالة تأخره في الانجاز وحسب المعادلة التالية
$$\text{مبلغ العقد} \times 10\% = \text{الغرامة لليوم الواحد وعلى ان لا تتجاوز } 10\% \text{ من قيمة العقد الكلية .}$$

مدة العقد بالايام
- ٢- في حالة تجاوز النسبة المذكورة في (١) اعلاه يحق للطرف الأول مصادرة التأمينات وإلزام الطرف الثاني إكمال تنفيذ العقد على حسابه بعد توجيه إنذار رسمي إليه خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين، كذلك يحق للطرف الأول المطالبة بالتعويض عن أي ضرر
- ٣- بعد بلوغ المدة التأخيرية ٢٥% من مدة العقد مضاف إليها أي مدد اضافية ممنوحة له يتم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالاسراع بانجاز العقد بما في ذلك تشكيل (لجنة اسراع) يمثل فيها المتعاقد للصرف على الاعمال المتبقية او سحب العمل بموجب شروط العقد .
- ٤- لا يجوز للطرف الثاني التنازل عن هذا العقد كلياً أو جزئياً إلا بعد موافقة الطرف الأول تحريراً وبشكل مسبق وبعبارة يحق للطرف الأول فسخ العقد دون الحاجة إلى إنذار أو حكم قضائي ومطالبة الطرف الثاني بالتعويض وتصادر كفالة حسن التنفيذ لصالح الطرف الأول وكذلك يجوز للطرف الأول الشراء على حساب الطرف الثاني وبشكل مباشر أو التعاقد مع شخص ثالث لهذا الغرض وتحميل الطرف الثاني فرق البديلين إضافة إلى تحميلات إدارية قدرها ٢٠% عشرون بالمائة من القيمة الفعلية للتنفيذ.

سادساً: مدة الصيانه

- ١- أن مدة الصيانه هي سنة واحدة تبدأ من تاريخ استلام البناية كاملة بدون نواقص من قبل لجنة يحددها الطرف الأول .
- ٢- يلتزم الطرف الثاني باعمال الصيانة شهرياً خلال فترة الصيانة وعلى الطرف الأول تشكيل لجنة لمتابعة ذلك من خلال تقديم تقارير شهرية خلال تلك المدة .

سابعاً: الظروف القاهرة

- ١- ان المقصود بالظروف القاهرة هي الظروف الخارجة عن ارادة كلا الطرفين المتعاقدين .
- ٢- ان الوضع الامني الراهن في العراق لا يعد ظرفاً قاهراً .
- ٣- الابلاغ عن ماهية الظرف القاهر وخلال مدة اسبوعين لضمان اجراء لقاء مشترك بين الطرفين المتعاقدين لايجاد حل مناسب لتجاوزه .
- ٤- تضاف مدة الظرف القاهر الى مدة العقد ولا تطبق عليه ما جاء في الفقرة الخامسة (الغرامات التأخيرية) .

ثامناً: احكام عامة :

١. تكون الشروط العامة لمقاولات اعمال الهندسة المدنيه بجزئها الاول والثاني جزء من العقد .
٢. في حالة حصول خلاف في تنفيذ بنود العقد يحل بطريقه وديه وفي حالة عدم الاتفاق فإن الخلاف يحال على المحاكم العراقية والمحاكم الادارية في بغداد .
٣. العقد خاضع لقانون استحصال الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧

١٠/١٠
السيد

١٠/١٠
السيد

القسم: المالية
الشعبة:

العدد: ٨٢٥١
التاريخ: ٢٠١٤/٩/١٨

معا لمساندة قوائنا المسلحة الياسلة لدحر الارهاب
الى /الهيئة العامة للضرائب فرع / الشركات
م/براءة ذمة

تم التعاقد مع المقاول الثانوي شركة وجه الخير للمقاولات العامة المحدودة عن اعمال /
تجهيز ومد قابلوات لمشروع الاكتفاء الذاتي وقد بلغ حسابه النهائي بموجب الذرعة النهائية
١٠٠٩١٨٥٥٠٠ فقط مليار وتسعة مليون ومائة وخمسة وثمانون الف وخمسمائة دينار
لاغيرها .

وقد تم استقطاع مبلغ ٢٦٣٥٣١٨٠ فقط ستة وعشرون مليون وثلاثمائة وثلاثة وخمسون الف
ومائة وثمانون دينار لاغيرها لصالح فرعكم وقد تم حجز المبلغ لصالح شركتنا عن الدين الذي
بذمتكم والبالغ ٤٩١١٥٥٩٢٣ فقط اربعمائة واحد وتسعون مليون ومائة وخمسة وخمسون
الف وتسعمائة وثلاثة وعشرون دينار لاغيرها ولحين تسديد المبلغ من قبل وزارة المالية
واستنادا لقرار محكمة التميز الاتحادية بالعدد /١٦١ هينة استئناف منقول ٢٠١٣ / ت / ٢٤٩ /
في ٢٠١٣ / ٢ / ١١ / والمكتسب الدرجة القطعية .

راجين تزويدنا ببراءة ذمة المقاول ليتسنى لنا تصفية مستحقاته

..... مع التقدير.....

١٣٠ يوم + ١٧٧ يوم مدة اضافية

٢٠١٠/٨/١٨

٢٠١٣/١١/٣

مواد+ عمل

٦١٧٦٤٧٠١٠ فقط ستمائة وسبعة عشر مليون وستمائة
وسبعة واربعون الف وعشرة دينار لاغيرها

مدة العقد

المباشرة

الانجاز

نوع العمل

السلف المصروف سابقا

المرفقات

كشف

المهندس
مختار اسماعيل علي
المدير العام ورئيس مجلس الادارة
٢٠١٤/٩/١٨



نسخه منه الى //

دائرة تقاعد وضمان بغداد لنفس الغرض اعلاه
الشركة العامة للاتصالات والبريد فرع /الرصافة
المالية / حسابات المقاولين
الاضبارة

ناد - النهضة - مجمع شركات وزارة الاعمار والاسكان - خلف معارض السيارات

ص. ب. 5784 - بريد الصالحية

www.rasheed.imariskan.gov.iq

E-mail: alrasheedcompny@yahoo.com

رف : مكتب المدير العام 8867418 8171267 - 8184164 بدالة

rasheedcompany@rasheed.imariskan.gov.iq



العدد: ٢٢٩
التاريخ: ٢١/١٠/٢٠٠٩

وزارة الاعمار والاسكان
شركة الفاروق العامة للمقاولات الانشائية
قسم الشؤون القانونية

الى المقاول / شركة وجه الخير للمقاولات العامة - السيد عبد الجبار احمد محمد
العضوان / كركوك - التأميم - الماس - هـ / ٠٧٧٠٢٥٦٩٢٣٩ - ٠٧٧٠٢٥٠٦٦٤٦

احالة عمل

يسرنا اعلامكم بأحالة مناقصة تنفيذ أعمال بنائة قاطع H لو ثلاث عمارات لمشروع مجمع الشموخ السكني في ذي قار/الناصرية (مواد+عمل) عدا مادة حديد التسليح والكونكريت تجهز من قبل الشركة على أن ينفذ العمل بموجب الشروط وجدول الكميات والمواصفات المطلوبة في المناقصة وتكون جميع المواد خاضعة للفحص المختبري المحدد من قبل الشركة .

وبموجب موافقة مجلس الإدارة لمرقم (٥٠) في ٢٠٠٩/٣/١ وتقرير لجنة التحليل والدراسة العروض المرقم (بلا) في ٢٠٠٩/ ٣ / ٢ والممستند على عطاكم المرقم (بلا) في ٢٠٠٩/٢/١٨ وبمبلغ إجمالي قدره (١,٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار واربعمائة وخمسون مليون دينار فقط لاخير.

وبموجب شروط الدعوة المرقمة (١٢٨٩) في ٢٠٠٩/ ٢ / ٩ وجداول لكميات والاسعار والملاحظات الواردة ضمن قرار لجنة التعهدات وعطائكم انفا' على ان ينفذ العمل بمدة قصاصها (١٢ اثنا عشر شهر) ومدة صيانة (سنة واحدة) من تاريخ الاستلام الأولي مع تحملكم لغرامة تأخيرية قدرها (٣٩٧,٢٦٠) ثلاثمائة وسبعة وتسعون الف ومائتان وستون دينار عن كل يوم تاخير في حالة عدم الالتزام بالمددة المحددة راجين مراجعة مقر الشركة القسم القانوني لغرض توقيع العقد مستصحبين معكم:-

١- للتأمينات النهائية والبالغه / ٧٢,٥٠٠,٠٠٠ لثنان وسبعون مليون وخمسمائة الف دينار على شكل صك مصدق او كفالة مصرفية.

٢- رسم الطابع الهندسي والبالغ / ٧٢٥,٠١٠ ببعمائة وخمسة وعشرون الف وعشرة دينار .

٣- رسم الطابع المالي البالغ / ٢,٩٠٠,٠٠٠ مليونان وتسعمائة الف دينار.

ويعتبر كتاب الاحالة بمثابة إزام للمقاول تترتب عليه كافة التبعات القانونية والمالية والفنية ويتوجب استكمال كافة إجراءات الاحالة وتوقيع العقد بموجب الشروط العامة لأعمال الهندسة المدنية وتعليمات العقود رقم (١) في لعام ٢٠٠٨ وخلال أربعة عشر يوم من تاريخ التبليغ بالاحالة أنفا' مع التقدير

المدير العام

مثنى عباس حسن

٢٠٠٩/٣/ ٨

نسخه منه الى/

- الهيئة العامة للضرائب/ الدخل للتأشير مع التقدير
- قسم المشاريع
- قسم الشؤون القانونية/ مع الأوليات
- المالية + الرقابة الداخلية
- مشروع مجمع الشموخ السكني في ذي قار

NO:
DATE:



العدد: ٧١٤٢
التاريخ: ٢٠١٠/٥/٢٤

الى / المقاول / شركته وجسه الخير للخدمات والاولات العامة المحدودة
المدير المفوض * عبد الجبار احمد محمد العنوان/ بغداد * مجاور فندق ميرديان * م ١٠٢ * ٤٥ مبنى ٧ * ط ٢
موبايل * ٠٧٧٠٢٥٦٩٢٣٩٩
(أحالة أعمال المناقصة رقم (٥٦١) لسنة ٢٠١٠ م)
(إنشاء دار سكنية لإدارة صيانة مشاريع ري وبزل كركوك / في محافظة كركوك)

استناداً الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب الأمر الوزاري المرقم ٥٠٧١ في ٢٠٠٨/٣/٣١ وبناءً على كتاب وزارة الموارد المائية المرقم ٧٣٧٤ في ٢٠١٠/٤/٨ وعلى ماجاء في توصية لجنة دراسة وتحليل العطاءات المشكلة بموجب الامر الاداري المرقم (٥٠٤٣) في ٢٠١٠/٣/٣٠ تقرر :-
١- أحالة أعمال المناقصة أعلاه بعهدتكم وبمبلغ إجمالي مقداره (١٢٣،١٩٠،٥٠٠) مائة وثلاثة وعشرون مليون ومائة تحفظات تبدأ من تاريخ توقيع العقد وبغرامة تأخرية (٨٢،١٢٧) أثنان وثمانون الف ومائة وسبعة وعشرون دينار عن كل يوم المسعور وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (١) لسنة ٢٠٠٨ والتي تعتبر جميعها جزء لا يتجزأ من عقد المقاوله.
٢- حضوركم شخصياً او من ينوب عنكم بموجب وكالة مصدقة من قبل كاتب العدل الى مقر الهيئة/ القسم القانوني لغرض توقيع العقد خلال اربعة عشر يوم من تاريخ تبليغكم بكتاب الاحالة مستصحبين معكم ما يلي :-
أ- تأمينات نهائية بمبلغ (٦،١٥٩،٥٢٥) ستة ملايين ومائة وتسعة وخمسون الف وخمسمائة وخمسة وعشرون دينار على شكل خطاب ضمان نافذ طيلة مدة العقد صادر من احد المصارف العراقية المعتمدة.
ب- أجور نشر الأعلان في الصحف المحلية البالغه (٢٧٠،٠٠٠) دينار) منتان وسبعون الف دينار ومراجعة شركة التأمين لغرض التأمين على المقاوله وتزويدنا بوثيقة التأمين او ماثبتت ان المعاملة قيد الانجاز والهيئة العامة للضرائب ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي لتقديم براءة الذمة ومراجعة وزارة الاتصالات لتقديم براءة الذمة المطلوبة منه .
ج- رسم صندوق تقاعد المهندسين (٦١،٥٩٣) واحد وستون الف وخمسمائة وثلاثة وتسعون دينار .
د- رسم طابع (٢٤٦،٣٨١) منتان وستة وأربعون الف وثلاثمائة وواحد وثمانون الف دينار .
٣- يعتبر كتابنا هذا تبليغاً رسمياً بالاحالة وجزأ لا يتجزأ من العقد
..... مع التقدير.

المدير العام
غني رزاق دخيل

نسخه منه الى :-

وزارة الموارد المائية/الدائرة القانونية والعقود/ للتفضل بالاطلاع... مع التقدير.
وزارة الموارد المائية/ دائرة التخطيط والمتابعة/ للتفضل بالاطلاع... مع التقدير.
وزارة التخطيط والتعاون الاممي/ مديرية الجهاز المركزي للاحصاء/ للتفضل بالاطلاع... مع التقدير.
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/ دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي/ للتفضل بالاطلاع... مع التقدير.
وزارة الاتصالات / الدائرة القانونية / قسم اتصالات بريد كركوك / للتفضل بالاطلاع... مع التقدير.
الهيئة العامة للضرائب/ للتفضل بالاطلاع... مع التقدير.
شركة التأمين الوطني/ التأمين الهندسي يرجى اجراء التأمين واعلامنا مع التقدير.
محافظة كركوك/ مكتب السيد المحافظ / للتفضل بالاطلاع... مع التقدير.
مديرية صيانة ري وبزل كركوك / للمتابعة.
البنك المركزي العراقي
القسم الفني
القسم القانوني
القسم الرقابي
القسم المالي
قسم التخطيط
قسم الاشراف والفحص الهندسي

البريد الإلكتروني : Email: ddprojects@yahoo.com

بغداد- السيديه- نهاية جسر الدوره
هـ / ٥٥٣٣٢١٩
بغداد- زيونة- مكتب بريد الضباط
ص.ب ١٩٠٠٧



NO. : GC \
DATE: \ \ 20

العدد: ع ١ / ١٣٢٢
التاريخ: ١٩ / ١١ / ٢٠١٣

إلى/ شركة وجه الخير للمقاولات العامة المحدودة
العنوان/ بغداد - مجاور فندق فلسطين مرديان
موبايل ٠٧٧٩٢٢٢٥٦٢-٠٧٧٠٦٠٠٩٠٣٧

E-mail: Wajh alkear @yahoo.com

م/احالة مناقصة رقم (٣) لسنة ٢٠١٣
مشروع(تأهيل وتطوير أبنية الأقسام العلمية والمراكز البحثية والتدريبية القائمة في الجامعة
التكنولوجية/قسم العلوم التطبيقية)

استناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا وبموجب كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم
(ع/٤٦٩٩ في ٢٣/١٠/٢٠١١) وما جاء في محضر لجنة تحليل وتدقيق العطاءات نحيل
إليك تنفيذ فقرات المناقصة (رقم ٣ لسنة ٢٠١٣) المدونة تفاصيلها في أدناه راجين حضوركم
إلى رئاسة الجامعة/ شعبة العقود الحكومية خلال فترة (١٤ يوم) عشر يوماً من تاريخ تبليغكم
بقرار الاحالة لتسديد الرسوم والتأمينات وإكمال إجراءات التعاقد وبخلافه يتم توجية أنذار
بضرورة توقيع العقد وبعد أنتهاء المدة القانونية للأنذار تعتبرون ناقلين ومستخذ كافة الإجراءات
القانونية بحكمكم.

التفاصيل:

١- التوبيخ //

المادة (٥) النوع (٢) تفصيل النوع (٣) التسلم (٢٥)

٢- اسم المشروع الرئيسي //

مشروع تأهيل وتطوير أبنية الأقسام العلمية والمراكز البحثية والتدريبية القائمة في الجامعة التكنولوجية/
قسم هندسة البناء والانشاءات (

٣- المبلغ مفصلاً //

أ- مبلغ الاحاله (٢٠٢١٠٠٠٠٠٠ دينار) فقط مائتان وأثنان مليون ومائة الف دينار.

ب- المبلغ الإجمالي (٢٢٢٣١٠٠٠٠٠ دينار) فقط مائتان وأثنان وعشرون مليون وثلاثمائة وعشرون
الف دينار.

الجامعة التكنولوجية
شعبة
العقود الحكومية
الصادره



العدد: ٢٢٩
التاريخ: ٢١/١٠/٢٠٠٩

وزارة الاعمار والاسكان
شركة الفاروق العامة للمقاولات الانشائية
قسم الشؤون القانونية

الى المقاول / شركة وجه الخير للمقاولات العامة - السيد عبد الجبار احمد محمد
العضوان / كركوك - التأميم - الماس - هـ / ٠٧٧٠٢٥٦٩٢٢٩ - ٠٧٧٠٢٥٠٦٦٤٦

احالة عمل

يسرنا اعلامكم بأحالة مناقصة تنفيذ أعمال بنائة قاطع H لو ثلاث عمارات لمشروع مجمع الشموخ السكني في ذي قار/الناصرية (مواد+عمل) عدا مادة حديد التسليح والكونكريت تجهز من قبل الشركة على أن ينفذ العمل بموجب الشروط وجدول الكميات والمواصفات المطلوبة في المناقصة وتكون جميع المواد خاضعة للفحص المختبري المحدد من قبل الشركة .

وبموجب موافقة مجلس الإدارة لمرقم (٥٠) في ٢٠٠٩/٣/١ وتقرير لجنة التحليل والدراسة العروض المرقم (بلا) في ٢٠٠٩/٣/٢ والمستند على عطاكم المرقم (بلا) في ٢٠٠٩/٢/١٨ وبمبلغ إجمالي قدره (١,٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار واربعمائة وخمسون مليون دينار فقط لاخير.

وبموجب شروط الدعوة المرقمة (١٢٨٩) في ٢٠٠٩/٢/٩ وجداول لكميات والاسعار والملاحظات الواردة ضمن قرار لجنة التعهدات وعطائكم انفا' على ان ينفذ العمل بمدة قصاصها (١٢ اثنا عشر شهر) ومدة صيانة (سنة واحدة) من تاريخ الاستلام الأولي مع تحملكم لغرامة تأخيرية قدرها (٣٩٧,٢٦٠) ثلاثمائة وسبعة وتسعون الف ومائتان وستون دينار عن كل يوم تاخير في حالة عدم الالتزام بالمددة المحددة راجين مراجعة مقر الشركة القسم القانوني لغرض توقيع العقد مستصحبين معكم:-

١- للتأمينات النهائية والبالغه / ٧٢,٥٠٠,٠٠٠ لثنان وسبعون مليون وخمسمائة الف دينار على شكل صك مصدق او كفالة مصرفية.

٢- رسم الطابع الهندسي والبالغ / ٧٢٥,٠١٠ ببعمائة وخمسة وعشرون الف وعشرة دينار .

٣- رسم الطابع المالي البالغ / ٢,٩٠٠,٠٠٠ مليونان وتسعمائة الف دينار.

ويعتبر كتاب الاحالة بمثابة إزام للمقاول تترتب عليه كافة التبعات القانونية والمالية والفنية ويتوجب استكمال كافة إجراءات الاحالة وتوقيع العقد بموجب الشروط العامة لأعمال الهندسة المدنية وتعليمات العقود رقم (١) في لعام ٢٠٠٨ وخلال أربعة عشر يوم من تاريخ التبليغ بالاحالة أنفا' مع التقدير

المدير العام

مثنى عباس حسن

٢٠٠٩/٣/٨

نسخه منه الى/

- الهيئة العامة للضرائب/ الدخل للتأشير.... مع التقدير
- قسم المشاريع
- قسم الشؤون القانونية/ مع الأوليات
- المالية + الرقابة الداخلية
- مشروع مجمع الشموخ السكني في ذي قار



كومار عيزاق

پاريز گالو كركوك
يل شل كاروبار ياسايغ
هوبلغ پروژمهكان

" لنجعل من الاهداف اليتمانية لسنة ٢٠٢٢ مكميلا لدوي الاعاقاة في المجتمع "

العدد /

التاريخ ٢٠١٣ / ١٢ / ٢٨

الى / شركة (وجه الخير للمقاولات) / العنوان (كركوك / عمارة الجدوع)
هاتف (٠٧٧١٨٥٨٠٤٢٦)

الموضوع / احوالة مناقصة

على مصادقة لجنة المراجعة والمصادقة وموافقة رئيس جهة التعاقد تقرر احوالة مشروع (بناء مخزن جملوني في الحويجة الديس - دافوق) على شركتكم واستناداً على ماورد بكتاب لجنة تدقيق الاحالات المرقم (١٢٩٤٩) في ٢٠١٣ / ١٠ / ٢١ ومرفقه " ما " (٥٨٠,٧٣٢,٥٠٠) ديناراً وكتابة " (خمسمائة وثمانون مليون وسبعمائة واثنان وثلاثون الف وخمسمائة دينار) حسب الخطي المقدم الى لجان فتح وتحليل العطاءات وبمدة تنفيذ العمل (٩٠ يوماً) كتابة (تسعون) يوماً اعتباراً من تاريخ سرة بالعمل عليه اقتضى حضوركم الى محافظة كركوك / قسم الشؤون القانونية لغرض تنظيم العقد مستصحبين معكم مبيئات النظامية المطلوبة ورسوم تصديق العقد تدفع الى قسم حسابات المحافظة وكما مبين في اناه لغرض تنظيم العقد يقيه حسب الاصول وبعد مرور (٧) (سبعة) ايام من تاريخ تليفكم بكتابنا هذا والمرسل اليكم بنسختين للتوقيع على النسخة الى منه واعادته اليها باعتبار كتاب احوالة هذا جزءاً من المستمسكات القانونية في حال عدم حصول شكوى .
مبيل المبالغ المطلوبة للمشروع :-
مبيئات النظامية (٢٩٠,٠٣٦,٦٢٥) تسعة وعشرون مليون وستة وثلاثون الف وستمائة وخمسة وعشرون دينار على ان يشكل صك مصدق او خطاب ضمان.
رسوم الهندسي (٥٨٠,٧٥٠) خمسمائة وثمانون الف وسبعمائة وخمسون دينار.
قسم تصديق العقد (١,١٦١,٥٠٠) مليون ومائة وواحد وستون الف وخمسمائة دينار.

الدكتور
نجم الدين عمر كريم
محافظ كركوك
٢٠١٣ / /

منه الى /

مجلس محافظة كركوك / للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
التخطيط والمتابعة / للعلم مع التقدير.
العامية للضرائب كركوك / لاتخاذ مايلزم مع التقدير.
تأمين الوطنية / فرع كركوك / لاتخاذ مايلزم مع التقدير.
عمل والضمان الاجتماعي / لاتخاذ مايلزم مع التقدير.
سابات المحافظة / لاتخاذ مايلزم مع التقدير.
بسة / لاتخاذ مايلزم مع التقدير.
تدقيق / للعلم مع التقدير.
تربية كركوك / لاتخاذ مايلزم مع التقدير.
التخطيط والمتابعة / قسم العقود / للعلم مع التقدير.
ة الخاصة.

جمهورية العراق

Ministry of Agriculture
The State Company for Animal
Resources Services
Legal Section

وزارة الزراعة
الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية
القسم القانوني
العدد : ١١٢٠
التاريخ : ٢٠١٠ / ٩ / ٢٦


الى / شركة شركة وجه الخير للمقاولات العامة المحدودة
العنوان / كركوك / التاميم / الماس
المسكن / بغداد م ٨٦٧ ز ١٢ د ٤

م / احوالة مناقصة

رقم (٥) لسنة ٢٠١٠ تنفيذ خزانات ماء لمشروع الاجداد في سامراء

استناداً الى توصية لجنة تدقيق وتحليل العطاءات المشكلة بالامر الاداري المرقم ١٦٢٠ في ٢٠١٠/٢/٩ ولجنة تدقيق العقود في مكتب المفتش العام بموجب الكتاب المرقم ٤٣/ع/٤٥/٣٦٩٤ في ٢٠١٠/٨/٣١ .
تقرر احوالة تنفيذ اعمال المناقصة رقم (٥) لسنة ٢٠١٠ (تنفيذ خزانات ماء لمشروع دواجن الاجداد في سامراء) بعهددة شركتكم وبمبلغ عطاءكم البالغ (١٣١٦٠٠٠٠٠) مائة وواحد وثلاثون مليون وستمائة الف دينار وبمدة تنفيذ (٦٠) ستون يوم من تاريخ المباشرة بالعمل على ان تنفذ المقاول اعلاه وفقاً للشروط والمواصفات الفنية وجدول الكميات المعدة من قبل القسم الهندسي في شركتنا ووفقاً للشروط العامة لاعمال المقاولات الهندسية وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (١) لسنة ٢٠٠٨ واية تعليمات نافذة بهذا الخصوص والتي تعتبر جزءاً من عقد المقاوله راجين حضوركم الى القسم القانوني/شعبة العقود في مقر الشركة مستصحبين معكم التأمينات القانونية (حسن التنفيذ) البالغة (٦٥٨٠٠٠٠) ستة ملايين وخمسمائة وثمانون الف دينار بموجب صك مصدق او خطاب ضمان صادر من احد المصارف في بغداد معززة بكتاب صحة صدور وبيد معتمد المصرف حصراً خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ تبليغكم بقرار الاحالة والتي تعتبر جزء من العقد لغرض توقيعه وبخلافه سوف يتم تنفيذ العمل على حسابكم وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة .

مع التقدير .



د. مصدق دلفي علي

المدير العام

ورئيس مجلس الادارة

٩/٢٦



نسخه منه الى :-

- وزارة الزراعة - مكتب المفتش العام / لجنة تدقيق العقود / كتابكم اعلاه للتفضل بالعلم . . . مع التقدير .
- مكتب المدير العام
- لجنة تحليل العطاءات
- قسم التخطيط والمتابعة
- القسم الهندسي
- القسم القانوني / شعبة العقود / مع الاوليات
- الملفة العامة

بيان تأسيس

شركة وجه الخير للمقاولات العامة محدودة المسؤولية

رأسمالها (٦٠٠٠٠٠٠٠) مئة مائة مليون دينار

الاسم / شركة وجه الخير للمقاولات العامة محدودة المسؤولية

مركز الشركة / العمري مركز كوكبة لها حق فتح الفروع داخل العراق وخارجه.

غرض الشركة وطبيعة العمل / المساهمة في استثمار رؤوس الأموال في مجال المقاولات العامة
شنية والكهربائية والميكانيكية وتشمل الأعمال المتعلقة بإنشاء وتوسيع وهدم المباني بأنواعها والطرق
سور والسدود والخزانات ومشروع الري والبزل والمواني وأعمال الماء والمجاري وغيرها من الأعمال
التي تتعلق بالمقاولات إنشائية وتبليط الطرق والشوارع كل ما يتعلق بنشاط الشركة ولم يذكر.

ولشركة في سبيل تحقيق غرضها ونشاطها القيام بما يأتي:-

تمتلك الأموال المنقولة اللازمة لتحقيق نشاطها ((من وسائل نقل مختلفة - وعمد وأدوات -
والآلات.. وغيرها)) وأجراء كافة التصرفات القانونية عليها وفق القوانين النافذة أو التي تحل
محلياً.

تمتلك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإجراء كافة التصرفات المسموح بها قانوناً .

تقديم بكافة المعاملات المالية المسموح بها والتعامل مع كافة المصارف المحلية.

المساهمة في جميع الشركات تأسيساً وشراءً وبيعاً واندماجاً - عدا الشركات التضامنية.

مزاولة جميع الأعمال المسموح بها قانوناً وفق حاجة الشركة ومصحة المساهمين وبما ينسجم مع
القوانين النافذة.

لأعمال المتعلقة بنصب وتركيب المعدات والمكائن ومحطات توليد الكهرباء ومحطات الضغط
وبدالات إخراج واعدن التكييف والتاسيسات الكهربائية والصحية والماء والمجاري والصرفي
والأبراج والتركيبات معدنية وغيرها من الأعمال التي تدخل في دائرة هذا الاختصاص وهذا الحق
في شراء ووهن وتأسيس المنشآت اللازمة لتحقيق الأغراض الواردة أعلاه لحساب الشركة أو
حساب الغير وبيعها في حالة انشاء الحاجة لها .



NO. : GC \
DATE: \ \ 20

العدد: ع ١ / ١٣٢٢
التاريخ: ١٩ / ١١ / ٢٠١٣

إلى/ شركة وجه الخير للمقاولات العامة المحدودة

العنوان/ بغداد- مجاور فندق فلسطين مرديان

موبايل ٠٧٧٩٢٢٢٥٦٢-٠٧٧٠٦٠٠٩٠٣٧

E-mail:Wajh alkear @yahoo.com

م/احالة مناقصة رقم (٣) لسنة ٢٠١٣

مشروع(تأهيل وتطوير أبنية الأقسام العلمية والمراكز البحثية والتدريبية القائمة في الجامعة
التكنولوجية/قسم العلوم التطبيقية)

استناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا وبموجب كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم
(ع/٤٦٩٩ في ٢٣/١٠/٢٠١١) وما جاء في محضر لجنة تحليل وتدقيق العطاءات نحيل
إليك تنفيذ فقرات المناقصة(رقم ٣ لسنة ٢٠١٣) المدونة تفاصيلها في أدناه راجين حضوركم
إلى رئاسة الجامعة/ شعبة العقود الحكومية خلال فترة (١٤ يوم) عشر يوماً من تاريخ تبليغكم
بقرار الاحالة لتسديد الرسوم والتأمينات وإكمال إجراءات التعاقد وبخلافه يتم توجية أنذار
بضرورة توقيع العقد وبعد أنتهاء المدة القانونية للأنذار تعتبرون ناقلين ومستخذ كافة الإجراءات
القانونية بحكمكم.

التفاصيل:

١- التوبيخ //

المادة (٥) النوع (٢) تفصيل النوع (٣) التسلم (٢٥)

٢- اسم المشروع الرئيسي //

مشروع تأهيل وتطوير أبنية الأقسام العلمية والمراكز البحثية والتدريبية القائمة في الجامعة التكنولوجية/
قسم هندسة البناء والانشاءات (

٣- المبلغ مفصلاً //

أ- مبلغ الاحاله (٢٠٢١٠٠٠٠٠٠ دينار) فقط مائتان وأثنان مليون ومائة الف دينار.

ب- المبلغ الإجمالي (٢٢٢٣١٠٠٠٠٠ دينار) فقط مائتان وأثنان وعشرون مليون وثلاثمائة وعشرون
الف دينار.

الجامعة التكنولوجية
شعبة
العقود الحكومية
الصادرة




شركة ربحية غير المنقولة / المبنى / المشي / عبد الجبار أحمد سعد
أمنون : محافظة بغداد / شارع الصعود / معالج فندق فلسطين مرديان / م / ١٠٦ / ٣ / ٤٥ / عمارة / ٢ / ط / ١ / شقة / ٥
في نفال / ٠٧٧.٢٥٦٩٢٣٩

إحالة مناقصة

إشارة إلى العرض المقدم من قبلكم وقرار لجنة دراسة وتحليل العطاءات المرقم (٢٦) في ٢٩/٣/٢٠١٠ تقرر :-
إحالة مناقصة (أصل تنفيذ القبولات الكبرى بقيمة لمشروع الاكتفاء الذاتي في دهوك) بعينكم وبمصر عطاؤكم البالغ
(٦٢٦,١٨٦٢٥٠) فقط ستمائة وستة وعشرون مليون ومائة وستة وثمانون ألف ومائتان وخمسون دينار شاملاً كل ما يتطلبه تنفيذ العمل
وإكمالها وفقاً للشروط والمواصفات الفنية والمخططات وجدول الكميات ومدة تنفيذ قدرها (١٤٠) مائة ولربعون يوماً تبدأ بعد (١٤) أربعة
شهر يوماً من تاريخ صدور كتاب الإحالة أو توقيع العقد أيهما سبق وفي حالة امتناعكم عن الحضور لتوقيع العقد خلال المدة أعلاه
تعرض غرامة تأخيرية قدرها (٤٤٧.٠٠٠) فقط لربعمائة وسبعة ولربعون ألف دينار سن كل يوم تأخير ولغاية (١٠%) من كلفة العقد
الكلية أو بلوغ المدة التأخيرية نسبة (٢٥%) من مدة العقد الأصلية وسيُمدد العمل منكم ويتخذ على حسابكم بأي طريقة كانت وتحملكم
فرق البندين لذا نرجو مراجعتكم إلى قسم الشؤون القانونية في الشركة خلال المدة المتكررة أعلاه لغرض توقيع العقد والمباشرة مستصحبين
عكم ما بقي :-

- ١- التأمينات النظامية : كفالة حسن الأداء نسبة (٥%) من قيمة العقد وقيلولة (٣٦:٣٠٩٣٥٠) فقط واحسد وثلاثون مليون وثلاثمائة
وسبعة ألف وثلاثمائة وخمسون دينار على شكل خطاب ضمان صانع مضمون معتمد في العراق ينظم
لمصلحة شركتكم ويلبسكم أو صلح مصدق .
- ٢- تصديق رسم الطابع المالي : البالغ (١,٢٥٢٣٧٤) فقط مليون ومائتان وستون ألف وثلاثمائة وستة وعشرون دينار والذي يسجل
نسبة (٢%) بالألف من قيمة العقد .
- ٣- تصديق رسم الطابع البندي : البالغ (٣١٣.٩٢) فقط ثلاثمائة وثلاثة عشر ألف وثلاثة وخمسون دينار والذي يسجل نسبة ١ / ٢ بالألف
من قيمة العقد .

... مع التقدير ...



المدير العام
إبراهيم طه اليامرني
٢٠١٠ / ٤ / ٢٠

نسخة منه إلى :-

- ☑ وزارة الأعمار والإسكان / دائرة المنشآت العام .. مع التقدير .
- ☑ وزارة الأعمار والإسكان / شعبة المتود / مركز الوزارة / للم .. مع التقدير .
- ☑ وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات / لدرجى اعلامنا بتسجيل الشركة المتكررة لنا لديمك .. مع التقدير .
- ☑ الهيئة العامة للضرائب / الدخل .. مع التقدير .
- ☑ دائرة التقاعد والامساك الاجتماعى للمساكن / للم .. مع التقدير .
- ☑ مكتب المدير العام / للم .. مع التقدير .
- ☑ مكتب السيدة المعاون / للم .. مع التقدير .
- ☑ قسم التخطيط والمتابعة / للم .. مع التقدير .
- ☑ قسم الخدمات الهندسية / لأعداد جدول الكميات .. لطفاً .
- ☑ مشروع الاكتفاء الذاتي في دهوك / اعلامنا تاريخ المباشرة الفعلي إذا ما بائس المقاول قبل توقيع العقد .. لطفاً .
- ☑ قسم الشؤون المالية .
- ☑ قسم الشؤون القانونية .
- ☑ الإضبارة / للحفظ .
- ☑ لجنة التمديدات .

المنه / ٢٠١٠ / ٣ / ٢٩ / مغنى

مخراش: سي الكيلاني (النيضة) بغداد - مكتب بريد الصالحية/ ص. ب. ٣٩١٧٨ / هاتف ٨١٨٩٧٦١ (صحة مطرط) / فاكس ٨٨٦٤٢٤٣ / البريد الإلكتروني @amuklink.net

Republic of Iraq

Ministry Of Electricity
General Directorate
Of Electrical Power
Transmission Upper
Euphrates Region



جمهورية العراق
وزارة الكهرباء
المديرية العامة
لدقل الطاقة الكهربائية لمنطقة الفرات الاعلى
مديرية الشؤون التجارية

العدد : ٧٦٢٥
التاريخ : ٢٠١٠ / ١٠ / ١١

الى / شركة وجه الخير للمقاولات العامة

م / احالة المناقصة المرقمة م.ف.ع. ٢٠١٠/٢

انشاء بناية مقر قاطع صيانة الرمادي

حصلت الموافقة على احالة المناقصة اعلاه والخاصة (انشاء بناية مقر قاطع صيانة الرمادي) بعهدة شركتكم وبمبلغ اجمالي قدره ١٨١٩٤٧٥٠٠ فقط مائة وواحد وثمانون مليون وتسعمائة وسبعة واربعون الف وخمسمائة دينار عراقي وفقا للشروط وجدول الكميات و الاسعار والمخططات والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من العقد ولا علاقة لمديريتنا بأرتفاع الاسعار للمواد الانشائية والمواد التي الداخلة في تنفيذ العمل، وبفترة تنفيذ (١٥٠) مائة وخمسون يوما تبدأ اعتبارا من تاريخ استلام الموقع على ان لا يتجاوز استلام الموقع (٥) ايام من تاريخ توقيع العقد، ومدة الصيانة سنة واحدة تبدأ من تاريخ استلام البناية كاملة بدون نواقص من قبل لجنة تحددها المديرية وتقوم شركتكم بأعمال الصيانة شهريا خلال فترة الصيانة وعلى مديريتنا تشكيل لجنة فنية لمتابعة ذلك من خلال تقديم تقارير شهرية خلال تلك المدة، وتكون طريقة تسديد المبلغ حسب الانجاز على شكل سلف وبموجب الذرعات وحسب قيمة الاعمال المنجزة المطابقة للمواصفات المطلوبة والمؤيدة من قبل دائرة المهندس المقيم للمشروع ووفقا لاحكام التسليف الواردة في القسم الثاني من الشروط العامة لاعمال الهندسة المدنية، مع قيامكم بكافة الفحوصات المختبرية وعلى نفقتكم وحسب شروط اعمال الهندسة المدنية مع تقديم برنامج سير العمل مثبت فيه تاريخ ابتداء العمل في المشروع ونهايته وحسب جدول الكميات المتفق عليه وقيامكم بالتأمين على اعمال المقاوله من كافة الوجوه والمخاطر وفقا لاعمال الهندسة المدنية وان يتم التأمين لدى شركة التأمين الوطنية / قسم التأمين الهندسي والاحالة خاضعة لشروط اعمال الهندسة المدنية بقسميها الاول والثاني، مع تزويدنا وقبل توقيع العقد بما يلي :

- جدول الكميات والاسعار لكل فقرة والتي ستكون جزء لا يتجزأ من العقد .
 - خطاب ضمان نافذ لحين انتهاء فترة الضمان بقيمة ٥% من قيمة العطاء (كفالة حسن الاداء) .
 - تسديد رسم الطابع البالغ ٠,٠٠٢ اثنان بالالف من قيمة العقد .
- يقدم ما ورد في اعلاه خلال ٣ ايام من تاريخ استلامكم كتاب الاحالة مع مراجعة المخول (مزود بكتاب تخويل) الى مديريتنا / الشؤون القانونية لاستلام نسخ العقد وانجاز توقيعه .

مع التقدير



عامر صادق فهيد

المدير العام

٢٠١٠ / ١٠ / ١١

نسخة منه الى /

- مديرية الشؤون القانونية / لاتخاذ ما يلزم واستكمال الاجراءات الواردة اعلاه وارسال نسخة من العقد الى ديوان الرقابة المالية...لطفا .
- مديرية الشؤون المالية / للعلم...لطفا .
- مديرية الرقابة الداخلية / ...للعلم لطفا .
- مديرية الخدمات الفنية / للعلم واتخاذ ما يلزم لطفا .
- مديرية الشؤون التجارية / المناقصات .

بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة ديوان الوقف السني
العقود

١. رقم المقالة / ٢٩ / ٢٠٠٨ / لبراد تاريخ العقد
٢. الطرف الأول / السيد رئيس ديوان الوقف السني اضافة لوظيفته / عنه السيد لؤي كمال جواد / المدير العام لدائرة الشؤون الهندسية / اضافة لوظيفته بموجب الامر الديواني المرقم ٦٥٥١ في ٢٠٠٨/٩/٤
٣. الطرف الثاني/ شركة وجه الخير للمقاولات العامة المحدودة مديرها المفوض السيد عبد الجبار احمد محمد اضافة لوظيفته بموجب قرار تأسيس الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٧/٢٨ والمصادق عليه بتاريخ ٢٠١٠/٣/٩
٤. اسم المقالة/ انتهاءات كلية البنات /جامعة الامام الأعظم
٥. مبلغ المقالة / (١٢١٢٩٧٣٥٠٠) مليار ومائتان واثنا عشر مليون وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة دينار
٦. مدة المقالة / (١٥٠) مائة وخمسون يوم تبدأ من تاريخ توقيع العقد
٧. مدة الصيانة / سنة واحدة تبدأ من تاريخ انجاز العمل
٨. مبلغ التأمينات / (٦٠٦٥٠٠٠٠) ستون مليون وستمائة وخمسون ألف دينار بموجب خطاب الضمان المرقم ٢٠١٠/١٤٤/٢٦٠٠
٩. مبلغ الغرامات التأخيرية عن كل يوم يتاخر فيه المقاول عن المدة: (٨٠٩٠٠٠) ثمانمائة وتسعة ألف دينار
١٠. أنى الطرف الثاني أو أفق واتعهد بانجاز المقالة اعلاه بمبلغ: (١٢١٢٩٧٣٥٠٠) مليار ومائتان واثنا عشر مليون وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة دينار
١١. تعتبر الشروط العامة لاعمال الهندسة المدنية (بقسميها الاول والثاني) والكهربائية والميكانيكية والكيميائية المعتمدة من قبل وزارة التخطيط والتعاون الامناني المعمول بها داخل العراق وكافة التعليمات التي تصدر من هذه الوزارة جزءاً لا يتجزأ من العقد في كل ما لم يرد به نص .
١٢. لايجوز للطرف الثاني اعطاء العمل لغيره او التنازل عنه دون موافقة الطرف الاول التحريري
١٣. عدم تنفيذ الطرف الثاني اي فقرة او عمل ما لم يتم استحصل موافقة الطرف الاول التحريرية ولا يعدت بالاوامر الشفوية وفي حالة قيام الطرف الثاني بالاعمال الغير مدرجة في الكشف ويرى انها ضرورية بدون امر او موافقة رسمية تحريرية من الطرف الاول فان هذه الاعمال تعتبر تبرعا وليس له حق الرجوع على الطرف الاول باي مبالغ تنشأ عنها
١٤. من حق الطرف الاول وقف العمل او المباشرة به لاي سبب يراه ولا يكون الطرف الثاني الحق بالرجوع على الطرف الاول باي شيء بسبب ذلك التوقف وفي حالة سحب العمل من الطرف الثاني لاي سبب فان الطرف الثاني يتحمل نتيجة ذلك تحميلات اداريه تبلغ بنسبة ٢٠ % من الكلفة الفعلية لقيمة المقالة .
١٥. للطرف الاول استحصل ما يترتب بذمة الطرف الثاني من حقوق ومبالغ وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧ او اي قانون يحل محله
١٦. تم التعاقد بموجب كتاب الاحالة المرقم ١٠٩٤ في ٢٠١٠/٢/٨
١٧. جرى التعاقد في بغداد ٢٠١٠ / ٣ / ١٤
١٨. تم استيفاء مبلغ (٢٤٢٦٠٠٠) مليونان وأربعمائة وستة وعشرون ألف دينار رسم الطابع المالي ومبلغ (٦٠٧٠٠٠) ستمائة وسبعة ألف دينار رسم الطابع الهندسي بموجب الوصل المرقم ٧٥٠٧٢٣ في ٢٠١٠/٣/١٤

الطرف الثاني

شركة وجه الخير للمقاولات العامة المحدودة مديرها المفوض السيد عبد الجبار احمد محمد اضافة لوظيفته بموجب قرار تأسيس الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٧/٢٨ والمصادق عليه بتاريخ ٢٠١٠/٣/٩
عنوان الشركة: مركز التلاميذ/فرع في بغداد مجاور فندق ميرديان م ١٠٢٢ (٥) عمارة (٧)
عنوان السكن: الجزائريه م ٣٢٢٣ ج ٤١٩٥٤٠ الصادر من مكتب معلومات الجزائر
هوية تصنيف المقاولين المرقمة ١٣٩ في ٢٠٠٨/٩/١٧
هوية الاحوال المدنية المرقمة ٥٨٨٧١٠ في ٢٠٠٨/٥/١٩ الصادرة من دائرة الكرخ
صاحب البطاقة التموينية المرقمة ٢٢٩٥٤٥
كتاب شركة التأمين الوطنية المرقم ٢٠١٠/٥/١٣ في ٢٠١٠/٣/١٠
كتاب براءة الذمة المرقم ٣٣٥٧/٩ في ٢٠١٠/٢/٢٨
موبايل ٠٧٧٠٢٥٦٩٢٣٢٠٠٧٧٠٧٥٦٦٦٦
فرح ٣/١٤

الطرف الاول
رئيس ديوان الوقف السني اضافة لوظيفته
عنه السيد لؤي كمال جواد
المدير العام لدائرة الشؤون الهندسية
اضافة لوظيفته
بموجب الامر الديواني المرقم ٦٥٥١ في
٢٠٠٨/٩/٤

شركة
وجه الخير
للمقاولات العامة المحدودة

بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة ديوان الوقف السني
العقود

١. رقم المقابلة / ٢٩ / ٢٠٠٨ / لبراد تاريخ العقد
٢. الطرف الأول / السيد رئيس ديوان الوقف السني اضافة لوظيفته / عنه السيد لؤي كمال جواد / المدير العام لدائرة الشؤون الهندسية / اضافة لوظيفته بموجب الامر الديواني المرقم ٦٥٥١ في ٢٠٠٨/٩/٤
٣. الطرف الثاني/ شركة وجه الخير للمقاولات العامة المحدودة مديرها المفوض السيد عبد الجبار احمد محمد اضافة لوظيفته بموجب قرار تأسيس الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٧/٢٨ والمصادق عليه بتاريخ ٢٠١٠/٣/٩
٤. اسم المقابلة/ انتهاءات كلية البنات /جامعة الامام الأعظم
٥. مبلغ المقابلة / (١٢١٢٩٧٣٥٠٠) مليار ومائتان واثنان عشر مليون وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة دينار
٦. مدة المقابلة / (١٥٠) مائة وخمسون يوم تبدأ من تاريخ توقيع العقد
٧. مدة الصيانة / سنة واحدة تبدأ من تاريخ انجاز العمل
٨. مبلغ التأمينات / (٦٠٦٥٠٠٠٠) ستون مليون وستمائة وخمسون ألف دينار بموجب خطاب الضمان المرقم ٢٠١٠/١٤٤/٢٦٠٠
٩. مبلغ الغرامات التأخيرية عن كل يوم يتاخر فيه المقاول عن المدة: (٨٠٩٠٠٠) ثمانمائة وتسعة ألف دينار
١٠. أنى الطرف الثاني أو أفق واتعهد بانجاز المقابلة اعلاه بمبلغ: (١٢١٢٩٧٣٥٠٠) مليار ومائتان واثنان عشر مليون وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة دينار
١١. تعتبر الشروط العامة لاعمال الهندسة المدنية (بسميها الاول والثاني) والكهربائية والميكانيكية والكيميائية المعتمدة من قبل وزارة التخطيط والتعاون الامناني المعمول بها داخل العراق وكافة التعليمات التي تصدر من هذه الوزارة جزءاً لا يتجزأ من العقد في كل ما لم يرد به نص .
١٢. لا يجوز للطرف الثاني اعطاء العمل لغيره او التنازل عنه دون موافقة الطرف الاول التحريري
١٣. عدم تنفيذ الطرف الثاني اي فقرة او عمل ما لم يتم استحصل موافقة الطرف الاول التحريرية ولا يعدت بالاوامر الشفوية وفي حالة قيام الطرف الثاني بالاعمال الغير مدرجة في الكشف ويرى انها ضرورية بدون امر او موافقة رسمية تحريرية من الطرف الاول فان هذه الاعمال تعتبر تبرعا وليس له حق الرجوع على الطرف الاول باي مبالغ تنشأ عنها
١٤. من حق الطرف الاول وقف العمل او المباشرة به لاي سبب يراه ولا يكون الطرف الثاني الحق بالرجوع على الطرف الاول باي شيء بسبب ذلك التوقف وفي حالة سحب العمل من الطرف الثاني لاي سبب فان الطرف الثاني يتحمل نتيجة ذلك تحميلات اداريه تبلغ بنسبة ٢٠ % من الكلفة الفعلية لقيمة المقابلة .
١٥. للطرف الاول استحصل ما يترتب بذمة الطرف الثاني من حقوق ومبالغ وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧ او اي قانون يحل محله
١٦. تم التعاقد بموجب كتاب الاحالة المرقم ١٠٩٤ في ٢٠١٠/٢/٨
١٧. جرى التعاقد في بغداد ٢٠١٠ / ٣ / ١٤
١٨. تم استيفاء مبلغ (٢٤٢٦٠٠٠) مليونان وأربعمائة وستة وعشرون ألف دينار رسم الطابع المالي ومبلغ (٦٠٧٠٠٠) ستمائة وسبعة ألف دينار رسم الطابع الهندسي بموجب الوصل المرقم ٧٥٠٧٢٣ في ٢٠١٠/٣/١٤

الطرف الثاني

شركة وجه الخير للمقاولات العامة المحدودة مديرها المفوض السيد عبد الجبار احمد محمد اضافة لوظيفته بموجب قرار تأسيس الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٧/٢٨ والمصادق عليه بتاريخ ٢٠١٠/٣/٩
عنوان الشركة: مركز التلاميذ/فرع في بغداد مجاور فندق ميرديان م ١٠٢٢ (٥) عمارة (٧)
عنوان السكن: الجزائريه م ٣٢٢ ج ٤١٩٥٤٠ الصادر من مكتب معلومات الجزائر
هوية تصنيف المقاولين المرقمة ١٣٩ في ٢٠٠٨/٩/١٧
هوية الاحوال المدنية المرقمة ٥٨٨٧١٠ في ٢٠٠٨/٥/١٩ الصادرة من دائرة الكرخ
صاحب البطاقة التموينية المرقمة ٢٢٩٥٤٥
كتاب شركة التأمين الوطنية المرقم ٢٠١٠/٥/١٣ في ٢٠١٠/٣/١٠
كتاب براءة الذمة المرقم ٣٣٥٧/٩ في ٢٠١٠/٢/٢٨
موبايل ٠٧٧٠٢٥٦٩٢٣٢٠٠٧٧٠٧٥٦٦٦٦
فرح ٣/١٤

الطرف الاول
رئيس ديوان الوقف السني اضافة لوظيفته
عنه السيد لؤي كمال جواد
المدير العام لدائرة الشؤون الهندسية
اضافة لوظيفته
بموجب الامر الديواني المرقم ٦٥٥١ في
٢٠٠٨/٩/٤

شركة
وجه الخير
للمقاولات العامة المحدودة

سابعا:- تستقطع نسبة ١٠% عشرة بالمئة من السلف المستحقة للطرف الثاني عن الاعمال المنفذة فعلا وفق المواصفات والجودة المطلوبة على ان لا يزيد مجموع الاستقطاعات عن نسبة ٥٠% خمسة بالمئة من كلفة المقاولة تطلق (٢,٥%) منها عند الاستلام الاولي (٢,٥%) عند الاستلام النهائي وبراءة ذمته من الضريبة والضمان.

ثامنا:- يحق للطرف الاول سحب وتنفيذ اية فقرة من فقرات العقد السابق من خلال لجنة مشتركة يمثل فيها المقاول (الطرف الثاني) مع تحميله نسبة تحميلات ادارية بمقدار ١٥% (لجنة اسراع العمل) في حالة تاخره في تنفيذ الفقرة من الموعد المحدد في البرنامج الزمني المصادق عليه من قبل (الطرف الاول)

تاسعا:- تستحصل الديون المترتبة بذمة الطرف الثاني عن الاعمال المنفذة فعلا وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧ او اي قانون يحل محله.

عاشرا:- يعمل بموجب الشروط العامة لمقاولات اعمال الهندسية المدنية والميكانيكية والكهربائية بقسميها الاول والثاني وتعديلاتها في كل حالة لها علاقة بتنفيذ هذه المقاولة والتي لم يرد ذكرها في هذا العقد.

احد عشر:- تعتبر النسخة الاصلية من هذا العقد الموقعة من الطرفين المحفوظة لدى الطرف الاول هي المعمول بها في حالات الاختلاف

اثنى عشر:- يعتبر العنوان المثبت في هذا العقد هو المعمول به في توجيه المراسلات والتبليغات بين الطرفين.

ثلاثة عشر:- على المقاول تأمين اعمال الحراسة على المقاولة المحالة بعهدته ويكون مسؤولا عن المفقودات طلبية مدة المقاولة.

اربعة عشر:- تعتبر المستندات المدرجة لاحقا جزء لا يتجزء من هذا العقد

أ- عطاء الطرف الثاني المرقم (بلا) في ٢١/١/٢٠٠٩

ب- الدعوة المرقمة (١٠٥٢٨) المؤرخة في ٣١/١٢/٢٠٠٨

ج- كتاب الاحالة المرقم بـ (١٢١٦) في ٨/٢/٢٠٠٩

د- الشروط العامة لمقاولات اعمال الهندسة المدنية بقسميها الاول والثاني

خمس عشر:- يتم اشعار الضريبة بتفاصيل العمل المحال بعهدته المقاول قبل صرف السلفة النهائية.

ستة عشر:- يقوم المقاول بتقديم التأمينات والرسوم الثابتة:-

أ- التأمينات النهائية والبالغة : ٣١,١٤١,٩٦٢ / واحد وثلاثون مليون ومائة وواحد وأربعون ألف وتسعمائة واثنان وستون دينار ونصف فقط


ب- رسم الطابع الهندسي والبالغ / ٣١١,٤٢٢ ثلاثمائة واحد عشر ألف وأربعمائة واثنان وعشرون دينار .

ج- رسم الطابع المالي البالغ / ١,٢٤٥,٦٧٨ مليون ومائتان وخمسة وأربعون ألف وستمائة وثمانية وسبعون دينار

وقد تم تسديد اجمالي التأمينات النهائية بموجب حفا ب. ح. ب. للمرقم (٦٠٠/٣) في ٢٠٠٩/٢/٢٠٠٩ والرسم الطابع المالي والرسم


الطابع الهندسي بموجب وصل القبض المرقم (٣٠١٢) في ١/٣/٢٠٠٩

حرر ببغداد بتاريخ ٢٠٠٩ / /


الطرف الاول

مدير عام شركة الفاروق العامة للمقاولات

الانشائية/ اضافة لوظيفته مثنى عباس حسن




الطرف الثاني

شركة وجه الخير للمقاولات العامة المحدودة

عبد الجبار احمد محمد

٢٠٠٩/٢/٢٠٠٩


منظم العقد
مراجبايع

٢٠٠٩/٢/٢٠٠٩

NO:
DATE:



العدد: ٧١٢٢
التاريخ: ٢٠١٠/٥/٢٤

الى / المقاول / شركته وجسه الخيبر للمقاولات العامة المحدودة
المدير المفوض * عبد الجبار احمد محمد العنوان/ بغداد * مجاور فندق ميرديان * م ١٠٢ * ٤٥ مبنى ٧ ط ٢
موبايل * ٧٧٠٢٥٦٩٢٣٩

(أحالة أعمال المناقصة رقم (٥٦١) لسنة ٢٠١٠ م)
(أنشاء دار سكنية لإدارة صيانة مشاريع ري وبزل كركوك / في محافظة كركوك)

استناداً الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب الأمر الوزاري المرقم ٥٠٧١ في ٢٠٠٨/٣/٣١ وبناءً على كتاب وزارة الموارد المائية المرقم ٧٣٧٤ في ٢٠١٠/٤/٨ وعلى ماجاء في توصية لجنة دراسة وتحليل العطاءات المشكّلة بموجب الأمر الإداري المرقم (٥٠٤٣) في ٢٠١٠/٣/٣٠ تقرر :-

- ١- أحالة أعمال المناقصة أعلاه بعهدتكم وبمبلغ إجمالي مقداره (١٢٢,١٩٠,٥٠٠) مائة وثلاثة وعشرون مليون ومائة تحفظات تبدأ من تاريخ توقيع العقد وبمدة تنفيذ أمدتها (١٥٠) مائة وخمسون يوماً بضمنها أيام الجمع والعطل الرسمية وبدون تأخير على ان ينفذ العمل وفق شروط المناقصة العامة والخاصة وحسب توجيهات المهندس المشرف وجدول الكميات المسعرة وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (١) لسنة ٢٠٠٨ والتي تعتبر جميعها جزء لا يتجزأ من عقد المقابلة.
- ٢- حضوركم شخصياً او من ينوب عنكم بموجب وكالة مصدقة من قبل كاتب العدل الى مقر الهيئة / القسم القانوني لغرض توقيع العقد خلال اربعة عشر يوم من تاريخ تبليغكم بكتاب الاحالة مستصحبين معكم ما يلي :-
 - أ- تأمينات نهائية بمبلغ (٦,١٥٩,٥٢٥) ستة ملايين ومائة وتسعة وخمسون الف وخمسمائة وخمسة وعشرون دينار على شكل خطاب ضمان نافذ طيلة مدة العقد صادر من احد المصارف العراقية المعتمدة.
 - ب- أجور نشر الاعلان في الصحف المحلية البالغة (٢٧٠,٠٠٠) دينار) منتان وسبعون الف دينار ومراجعة شركة التأمين لغرض التأمين على المقابلة وتزويدنا بوثيقة التأمين او ما يثبت ان المعاملة قيد الاتجاز والهيئة العامة للضرائب والجهات المركزي للاحصاء او فروعها في المحافظات لتزويدهم بالمعلومات الاحصائية
 - ج- رسم صندوق نقاعد المهندسين (٦١,٥٩٣) واحد وستون الف وخمسمائة وثلاثة وتسعون دينار .
 - د- رسم طابع (٢٤٦,٣٨١) منتان وستة واربعون الف وثلاثمائة واحد وثمانون الف دينار .
 - ٣- يعتبر كتابنا هذا تبليغاً رسمياً بالاحالة وجزأ لا يتجزأ من العقد

..... مع التقدير.

المدير العام
غني رزاق دخيل

نسخه منه الى :-

- وزارة الموارد المائية/الدائرة القانونية والعقود/ للتفضل بالاطلاع... مع التقدير.
- وزارة الموارد المائية/ دائرة التخطيط والمتابعة/ للتفضل بالاطلاع... مع التقدير.
- وزارة التخطيط والتعاون الامني/ مديرية الجهاز المركزي للاحصاء/ للتفضل بالاطلاع... مع التقدير.
- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/ دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي/ للتفضل بالاطلاع... مع التقدير.
- وزارة الاتصالات / الدائرة القانونية / قسم اتصالات بريد كركوك / للتفضل بالاطلاع... مع التقدير.
- الهيئة العامة للضرائب/ للتفضل بالاطلاع... مع التقدير.
- شركة التأمين الوطني/ التأمين الهندسي يرجى اجراء التأمين واعلامنا مع التقدير.
- محافظة كركوك/ مكتب السيد المحافظ / للتفضل بالاطلاع... مع التقدير.
- مديرية صيانة ري وبزل كركوك / للمتابعة.
- البنك المركزي العراقي
- القسم الفني
- القسم القانوني
- القسم الرقابي
- القسم المالي
- قسم التخطيط
- قسم الاشراف والفحص الهندسي

NO. : GC \ \
DATE : \ \ 20

العدد : ع ١٣٢٢١
التاريخ : ١٩ / ١١ / ٢٠١٣

إلى/ شركة وجه الخير للمقاولات العامة المحدودة
العنوان/ بغداد - مجاور فندق فلسطين مرديان
موبايل ٠٧٧٩٢٢٢٥٦٢-٠٧٧٠٦٠٠٩٠٣٧

E-mail:Wajh alkear @yahoo.com

م/احالة مناقصة رقم (٣) لسنة ٢٠١٣

مشروع(تأهيل وتطوير أبنية الاقسام العلمية والمراكز البحثية والتدريبية القائمة في الجامعة
التكنولوجية/قسم العلوم التطبيقية)

استناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا وبموجب كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم
(ع/٤٦٩٩ في ٢٣/١٠/٢٠١١) وما جاء في محضر لجنة تحليل وتدقيق العطاءات نحيل
إليكم تنفيذ فقرات المناقصة(رقم ٣ لسنة ٢٠١٣) المدونة تفاصيلها في أدناه راجين حضوركم
إلى رئاسة الجامعة/ شعبة العقود الحكومية خلال فترة (١٤ يوم) عشر يوماً من تاريخ تبليغكم
بقرار الاحالة لتسديد الرسوم والتأمينات وإكمال إجراءات التعاقد وبخلافه يتم توجية أذار
بضرورة توقيع العقد وبعد انتهاء المدة القانونية للانذار تعتبرون ناقلين وستتخذ كافة الإجراءات
القانونية بحكمكم.

التفاصيل :

١- التوبيخ //

المادة (٥) النوع (٢) تفصيل النوع (٣) التسلسل (٢٥)

٢- اسم المشروع الرئيسي //

مشروع تأهيل وتطوير أبنية الاقسام العلمية والمراكز البحثية والتدريبية القائمة في الجامعة التكنولوجية/
قسم هندسة البناء والانشاءات)

٣- المبلغ مفصلاً //

أ- مبلغ الاحاله (٢٠٢١٠٠٠٠٠ دينار) فقط مائتان وأثنان مليون ومائة الف دينار .

ب- المبلغ الإجمالي (٢٢٢٣١٠٠٠٠ دينار) فقط مائتان وأثنان وعشرون مليون وثلاثمائة وعشرة
الف دينار.

الجامعة التكنولوجية
شعبة
العقود الحكومية
الصادر



بسم الله الرحمن الرحيم
مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل



الادارة العامة

فرع البادية

العدد / ١١٠٢ / ب

التاريخ / ١٧ / ١٠ / ٢٠١٢

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل / فرع البادية
الى / وزارة الزراعة/دائرة البيطرة
م/ كفاءة مالية

تحية طيبة ...

نؤيد لكم بان شركة (وجه الخير للمقاولات العامة) لديها حساب جاري
لدينا رقم (٣٣٢١) وان كفائته المالية (جيدة) والمصرف لا يتحمل أي
مسؤولية قانونية ومالية من هذا التأييد .

مع جزيل الشكر والتقدير.....

نسخة منه الى الاضبارة الشخصية

لينا فارس حمزة

عن/فرع البادية/٦٠٧



عاشراً : في حالة عجز الطرف الثاني عن تنفيذ العمل يقوم الطرف الاول وفقاً للمادة (٦٥) من شروط المقاولة لأعمال الهندسة المدني بتوجيه اذار تحريري اليه بتنفيذ العمل ومنحه مهلة لمدة (١٤) يوم وفي حالة توقفه او تركه في العمل يحق للطرف الاول سحب العمل منه وتنفيذه على حسابه مع تحميله كافة فروقات الاسعار والاضرار الناجمة دون اللجوء الى المحكمة او انتهاء العقد فوراً او تسوية الحسابات النهائية دون اي تعويض للطرف الثاني على ان لا يخل هذا بحقوق الطرف الاول في المطالبة باي تعويض يستحقه من جراء سحبه للعمل وانتهائه للمقاولة وفق المادة المذكورة اعلاه .

احدى عشر : تستحصل الديون المترتبة بذمه الطرف الثاني نتيجة اخلاله بشروط هذا العقد من اي مبالغ مستحقة له من اي مصدر كان دون اللجوء الى المحكمة وفي حالة عدم وجود مستحقات يتم تحصيلها وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧ او اي قانون اخر يحل محله .

اثني عشر : يتحمل الطرف الثاني تنفيذ فقرات العقد المحاله بعهدته مباشرة ولا يجوز له التنازل عنها لمقاول اخر او التعاقد معه من الباطن لتنفيذ اي جزء من الاعمال او اي منفعة الا بعد استحصال موافقة الطرف الاول التحريري .

ثلاثة عشر : على المقاول تقديم منه اسامى العمل الى دائرة المهندس المقيم خلال مدة (٧) ايام من تاريخ نفاذ هذا العقد .

اربعة عشر : يكون الطرف الثاني مسؤولاً عن الاضرار التي تلحق به وبمستقدميه وبممتلكاته وبموجوداته او التي تحدث في المشروع او بالاعمال او بالغير ابتداءً من تاريخ نفاذ العقد لغايه تاريخ انجازه وتسلمه منه نهائياً من قبل الطرف الاول وبموجب الشروط العامة لاعمال الهندسة المدني .

خمسة عشر : على الطرف الثاني تقديم خطاب ضمان صادر عن احد المصارف العراقية نافذ لغايه انتهاء العمل بمبلغ (٦,٦٧٦,١٧٥) ستة مليون وستمائة وستة وسبعون الف ومائة وخمسة وسبعون دينار عن حسن التنفيذ نافذ طيلة مدة العقد يتم اطلاقه وفق احكام الشروط العامة للعقد .

سبعة عشر : على الطرف الثاني تسديد مبلغ صندوق تقاعد المهندسين والبالغ (٦٦,٧٥٩) ستة وستون الف وسبعمائة وتسعة وخمسون دينار فقط ورسم الطابع البالغ (٢٦٧,٠٤٧) مائتان وسبعة وستون الف وسبعة واربعون دينار فقط واجور نشر الاعلان البالغة (٣٤٨,٧٥٠) ثلاثمائة وثمانية واربعون الف وسبعمائة وخمسون دينار فقط .

سبعة عشر : على الطرف الثاني الالتزام بعدم تعيين اقارب واصدقاء الموظفين الحكوميين في المشاريع التي تقع ضمن تعاقدهم هؤلاء الموظفين وعلى المقاول ايضاً عدم تعيين اي موظف حكومي سابق من الذين عملوا في الدوائر والاقسام التي لها علاقة بالعقد ولغايه سنة واحدة بعد انتهاء خدمته الوظيفية في الحكومة .


ثمانية عشر : تختص المحاكم العراقية بالنظر في الدعاوى الناشئة عن هذا العقد .

تسعة عشر : لا يعتبر الظرف الامني من الظروف القاهرة التي تدعو المقاول الى المطالبة بالتعويض .

عشرون : تعتبر النسخة الاصلية من هذا العقد المحررة باللغة العربية الموقعة بين الطرفين والمحافظة لدى الطرف الاول هي النسخة المعول عليها عند الاختلاف عن النسخ الاخرى .


واحد وعشرون : يعتبر العنوان المثبت في هذا العقد هو المعول عليه في المراسلات والتبليغات بين الطرفين .

اثنان وعشرون : وقع العقد بتاريخ ٢٠١٠ / ١٠ / ٢٠ م الموافق ١٤٣١ / ١٠ / ٢٠ هـ



الطرف الاول
مدير عام الهيئة العامة لصيانة مشاريع الري والرياح
أضافه لوظيفته
بغداد - السويديّة - نهاية جسر الدورة

الطرف الثاني
شركة وجّه الخير للمقاولات العامة المحدودة
المدير المفوض / عبد الجبار أحمد محمد
العنوان :- بغداد - مجاور فندق ميرديان
١٠٢ - ز ٤٥ مبنى ٧ - ط ٢
موبايل : ٠٧٧٠٢٥٦٩٢٣٩



بسم الله الرحمن الرحيم

REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of Reconstruction & Housing
Al-Mansour S. C. C. Co.



جمهورية العراق
وزارة الاعمار والاسكان
شركة المنصور العامة للمقاولات الإنشائية
قسم القانونية

No.:

Date:

الرقم: ٥٤٥٦

التاريخ: ٢٠١٠/٦/١٦

إلى / شركة وجه الخير للمقاولات العامة المحدودة / المدير المفوض عبد الجبار احمد محمد
العنوان / بغداد - الكرادة

الموبايل / ٠٧٧٠٢٥٦٩٢٢٩ - ٠٧٩٠١٨٦٠٢١٧

E-mail: Wajh alkear@yahoo.com

م/اجالة

استنادا الى قرار مجلس الادارة في جلسته الاستثنائية (السابعة) في ٢٠١٠/٦/٧ وقرار لجنة التعهدات المركزية
المعرقم ١٨ في ٢٠١٠/٥/٣١ تقرر احالة مناقصة توريد ونصبت خزانات الوقود والزيوت والماء الصافي والحريق
لمشروع الاكتفاء الذاتي موقع الكسك ببيدككم بمبلغ مقداره (٧٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار سبعة مائة وستون
مليون دينار شاملا كل ما يتطلبه تنفيذ العمل واكتماله وفقا للشروط والمواصفات الفنية والمخططات وجدول
الكميات وبمدة تنفيذ امدها (٩٠) يوم وبغرامة تأخيريه مقدارها (١٧٤٠٠٠٠) دينار ثمانمائة واربعه وسبعون الف
واربعمائة وخمسه واربعون دينار عن كل يوم تاخير وتجاوز ١% من مبلغ العقد او بلوغ المدة التأخيريه نسبة
٢٥% من (مدة العقد مضاف اليه اي مبلغ اضافيه مسموحه) وبسبب العمل وينفذ على حسابكم وفق القانون
وتحميلكم فرق البديلين. لذا نرجو مراجعتكم مقر الشركة كقسم القانونيه مستعجلين معكم الاتي :-
تأمينات حسن التنفيذ مبلغ (٢٩٠٠٠٠٠٠) دينار وبموجبها من حق مطبق او خطايب ضمان يشمل
مدة التنفيذ + فترة الصيانه.

- رسم طابع مالي مبلغ (١٠٥٧٤٠٠٠٠) دينار
- رسم طابع هندسي مبلغ قدره (٢٩٢٠٠٠) دينار
- رسم رسو مناقصة مبلغ (١٠٠٠) دينار
- اجور نشر الإعلان (٢٦٢٠٠٠) دينار

لاكمال اجراءات التعاقد وتوقيع العقد وخلال (١٤) يوم من تاريخ كتاب الاحاله هذا وبخلافه سيتم اتخاذ الاجراءات
القانونيه وفقا للفقرة (ج) من البند (عشرون) من المادة (٧) من تعليمات تنفيذ العقود الحكوميه رقم (١) لسنة ٢٠٠٨.
مع التقدير.....

وزارة الاعمار والاسكان
شركة المنصور العامة للمقاولات الإنشائية
المدير المفوض
عبد الجبار احمد محمد

بغداد - ساحة المتحف - موقع الشركة على الانترنت
www.almansourco.com

مكتب البريد بغداد / صندوق بريد / 55037 / 5373847

٢٠١٠/٦/١٥

فروع الشركة : بابل - كركوك - الموصل

بسم الله الرحمن الرحيم

REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of Reconstruction & Housing
Al-Mansour S. C. C. Co.



جمهورية العراق
وزارة الاعمار والاسكان
شركة المنصور العامة للمقاولات الإنشائية
قسم القانونية

No.:

Date:

الرقم: ٥٤٥٦

التاريخ: ٢٠١٠/٦/١٦

إلى / شركة وجه الخير للمقاولات العامة المحدودة / المدير المفوض عبد الجبار احمد محمد
العنوان / بغداد - الكرادة

الموبايل / ٠٧٧٠٢٥٦٩٢٢٩ - ٠٧٩٠١٨٦٠٢١٧

E-mail: Wajh alkear@yahoo.com

م/اجالة

استنادا الى قرار مجلس الادارة في جلسته الاستثنائية (السابعة) في ٢٠١٠/٦/٧ وقرار لجنة التعهدات المركزية
المرقم ١٨ في ٢٠١٠/٥/٣١ تقرر احالة مناقصة توريد ونصت خزانات الوقود والزيوت والماء الصافي والحريق
لمشروع الاكتفاء الذاتي موقع الكسك ببيدككم بمبلغ مقداره (٧٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار سبعة مائة وستون
مليون دينار شاملا كل ما يتطلبه تنفيذ العمل واكتماله وفقا للشروط والمواصفات الفنية والمخططات وجدول
الكميات وبمدة تنفيذ امدها (٩٠) يوم وبغرامة تأخيريه مقدارها (١٧٤٠٠٠٠٠) دينار ثمانمائة واربعه وسبعون الف
واربعمائة وخمسه واربعون دينار عن كل يوم تاخير وتجاوز ١% من مبلغ العقد او بلوغ المدة التأخيريه نسبة
٢٥% من (مدة العقد مضاف اليه اي مبدأ اضافيه مبنوحه) وبسبب العمل وينفذ على حسابكم وفق القانون
وتحميلكم فرق البديلين. لذا نرجو مراجعتكم مقر الشركة كقسم القانونيه مستعجلين معكم الاتي :-
تأمينات حسن التنفيذ مبلغ (٢٩٠٠٠٠٠٠) دينار وبموجب ذلك مطبق او خطايب ضمان يشمل
مدة التنفيذ + فترة الصيانه.

- رسم طابع مالي مبلغ (١٠٥٧٤٠٠٠٠) دينار
- رسم طابع هندسي مبلغ قدره (٢٩٢٠٠٠) دينار
- رسم رسو مناقصة مبلغ (١٠٠٠) دينار
- اجور نشر الإعلان (٢٦٢٠٠٠) دينار

لاكمال اجراءات التعاقد وتوقيع العقد وخلال (١٤) يوم من تاريخ كتاب الاحاله هذا وبخلافه سيتم اتخاذ الاجراءات
القانونيه وفقا للفقرة (ج) من البند (عشرون) من المادة (٧) من تعليمات تنفيذ العقود الحكوميه رقم (١) لسنة ٢٠٠٨.
مع التقدير.....

وزارة الاعمار والاسكان
شركة المنصور العامة للمقاولات الإنشائية
المدير المفوض
عبد الجبار احمد محمد

بغداد - ساحة المتحف - موقع الشركة على الانترنت
www.almansourco.com

مكتب البريد بغداد / صندوق بريد / 55037 / 5373847

٢٠١٠/٦/١٥

فروع الشركة : بابل - كركوك - الموصل

العدد: ٢٢٩
التاريخ: ٢١/١٠/٢٠٠٩

وزارة الاعمار والاسكان
شركة الفاروق العامة للمقاولات الامشائية
قسم الشؤون القانونية

الى المقاول / شركة وجه الخير للمقاولات العامة - السيد عبد الجبار احمد محمد
العضوان / كركوك - التاميم - الماس - هـ / ٠٧٧.٢٥٦٩٢٣٩ - ٠٧٧.٧٥٠.٦٦٤٦

احالة عمل

يسرنا اعلامكم بأحالة مناقصة تنفيذ أعمال بنابة قاطع H ذو ثلاث عمارات لمشروع مجمع الشموخ السكني في ذي قار/الناصرية (مواد+عمل) عدا مادة حديد التسليح والكونكريت تجهز من قبل الشركة على أن ينفذ العمل بموجب الشروط وجدول الكميات والمواصفات المطلوبة في المناقصة وتكون جميع المواد خاضعة للفحص المخبري المحدد من قبل الشركة .


وبموجب موافقة مجلس الإدارة المرقم (٥٠) في ٢٠٠٩/٣/٤ وتقرير لجنة التحليل والدراسة العروض المرقم (بلا) في ٢٠٠٩/ ٣ / ٢ والمستند على عطكم المرقم (بلا) في ٢٠٠٩/٢/١٨ وبمبلغ إجمالي قدره (١,٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار واربعمائة وخمسون مليون دينار فقط لاخير.
وبموجب شروط الدعوة المرقمة (١٢٨٩) في ٢٠٠٩/ ٢ / ٩ وجداول الكميات والاسعار والملاحظات الواردة ضمن قرار لجنة التعهدات وعطانكم انفا" على ان ينفذ العمل بمدة اقصاها (١٢ اثنا عشر شهر) ومدة صيانة (سنة واحدة) من تاريخ الاستلام الأولي مع تحملك لغرامة تأخيرية قدرها (٣٩٧,٢٦٠) ثلاثمائة وسبعة وتسعون الف ومائتان وستون دينار عن كل يوم تاخير في حالة عدم الالتزام بالمدة المحددة راجين مراجعة مقر الشركة القسم القانوني لغرض توقيع العقد مستصحبين معكم:-

١- التأمينات النهائية والبالغة / ٧٢,٥٠٠,٠٠٠ لثنان وسبعون مليون وخمسمائة الف دينار على شكل صك مصدق او كفالة مصرفية.

٢- رسم الطابع الهندسي والبالغ / ٧٢٥,٠١٠ سبعمائة وخمسة وعشرون الف وعشرة دينار .

٣- رسم الطابع المالي البالغ / ٢,٩٠٠,٠٠٠ مليونان وتسعمائة الف دينار.

ويعتبر كتاب الإحالة بمثابة إزام للمقاول تترتب عليه كافة التبعات القانونية والمالية والفنية ويتوجب استكمال كافة إجراءات الإحالة وتوقيع العقد بموجب الشروط العامة لأعمال الهندسة المدنية وتعليمات العقود رقم (١) في لعام ٢٠٠٨ وخلال أربعة عشر يوم من تاريخ التبليغ بالإحالة أنفا" مع التقدير



المدير العام

مثنى عباس حسن

٢٠٠٩/٣/ ٨

نسخه منه الى/

- الهيئة العامة للضرائب/ الدخول للتأشير مع التقدير
- قسم المشاريع
- قسم الشؤون القانونية/ مع الأوليات
- المالية + الرقابة الداخلية
- مشروع مجمع الشموخ السكني في ذي قار

الى المقاول / شركة وجه الخير للمقاولات العامة - السيد عبد الجبار احمد محمد
العنوان / كركوك - طريق بغداد هـ ٠٧٧٠٢٥٩٩٢٣٩ - ٠٧٧٠٧٥٠٦٦٤٦ - ٠٧٩٠١٤٣٩٥١٦

احالة عميل

يسرنا اعلامكم بأحالة مناقصة تنفيذ اعمال بناية السوق - المركز الصحي - غرفة حارس عدد ٢ في مشروع مجمع الشموخ السكني في ذي قار/الناصرية (مواد+عمل) عدا مادة حديد التسليح والكونكريت تجهز من قبل الشركة على أن ينفذ العمل بموجب الشروط وجدول الكميات والمواصفات المطلوبة في المناقصة وتكون جميع المواد خاضعة للفحص المختبري المحدد من قبل الشركة .

وبموجب موافقة مجلس الإدارة المرقم (١٨) في ٢٧/١/٢٠٠٩ وتقدير لجنة التحليل والدراسة العروض المرقم (بلا) في ٢٢ / ١ / ٢٠٠٩ والمستند على عطائكم المرقم (بلا) في ٢١/١/٢٠٠٩ وبمبلغ إجمالي قدره (٦٢٢,٨٣٩,٢٥٠) ستمائة واثنان وعشرون مليون وثمانمائة وتسعة وثلاثون ألف ومائتان وخمسون دينار فقط لاغير.

وبموجب شروط الدعوة المرقمة (١٠٥٢٨) في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٨ وجدول الكميات والاسعار والملاحظات الواردة ضمن قرار لجنة التعهدات وعطائكم انفا" على ان ينفذ العمل بمدة قصاها (٩ تسعة أشهر) ومدة صيانة (سنة واحدة) من تاريخ الاستلام الأولي مع تحملكم لغرامة تأخرية قدرها (٢٣٠,٦٨٠) مائتان وثلاثون الف وستمائة وثمانون دينار عن كل يوم تاخير في حالة عدم الالتزام بالمدة المحددة راجين مراجعة مقر الشركة القسم القانوني لغرض توقيع العقد مستصحبين معكم:-

١- التأمينات النهائية والبالغة / ٥ : ٣١,١٤١,٩٦٢ واحد وثلاثون مليون ومائة وواحد وأربعون ألف وتسعمائة واثنان وستون دينار ونصف فقط على شكل صك مصدق او كفالة مصرفية.

٢- رسم الطابع الهندسي والبالغ / ٣١١,٤٢٢ ثلاثمائة واحد عشر ألف وأربعمائة واثنان وعشرون دينار .

٣- رسم الطابع المالي البالغ / ١,٢٤٥,٦٧٨ مليون ومائتان وخمسة وأربعون ألف وستمائة وثمانية وسبعون دينار.

ويعتبر كتاب الإحالة بمثابة إزام للمقاول تترتب عليه كافة التبعات القانونية والمالية والفنية ويتوجب استكمال كافة إجراءات الإحالة وتوقيع العقد بموجب الشروط العامة لأعمال الهندسة المدنية وتعليمات العقود رقم (١) قسي لعام ٢٠٠٨ وخلال أربعة عشر يوم من تاريخ التبليغ بالإحالة أنفا" مع التقدير

المدير العام

مثنى عباس حسن

٢٠٠٩/٢/١٨

نسخه منه الى/

- الهيئة العامة للضرائب/ الدخل للتأشير.... مع التقدير
- قسم المشاريع
- قسم الشؤون القانونية/ مع الأوليات
- المالية + الرقابة الداخلية
- مشروع مجمع الشموخ السكني في ذي قار



العدد: ق ن ١٧٨١
التاريخ: ٢٠١٠/٧/٧

إلى / المقاول / شركة وجه الخير للمقاولات المحدودة / المدير المفوض / عبد الجبار احمد محمد الطالباتي
العنوان: بغداد - شارع السعدون - مجاور فندق فلسطين مريديان محل رقم ٦٠٤ حافة ص ٢٤
٠٧٧٠٢٥٦٩٢٢٣٩ و ٠٧٩٠١٨٦٠٢١٧

م / إحالة أعمال تصديق وتصحيح وترتيب خزانات العقود والالتزامات المتروكة للمشروع الإنشائي الذي في المرفق
إشارة إلى العرض المقدم من قبلكم وقرار لجنة تحليل ودراسة العطاءات المرقم (١١) في ٢٠١٠/٧/١ تقرر:-
إحالة مناقصة إحالة أعمال تصديق وتصحيح وترتيب خزانات العقود والالتزامات المتروكة للمشروع الإنشائي الذي في المرفق
وبسعر عطاؤكم البالغ (٥٩١,٤٠٠,٠٠٠) فقط خمسمائة وواحد وتسعون مليون واربعمائة الف دينار شاملا كل ما ي
تنفيذ العمل واكماله وفقاً للشروط والمواصفات الفنية والمخططات وجداول الكميات ومدة تنفيذ قدره (٦٠) ستون
تبدأ من تاريخ تبليغكم بالإحالة وتوقيع العقد والتي تكون خلال (١٤) يوم من تاريخ صدور كتب الإحالة وبعبارة
غرامة تأخيرية قدرها (٩٨٦,٠٠٠) فقط تسعمائة وستة وثمانون ألف دينار عن كل يوم تأخير ولغاية (١٠%) من
العقد الكلية أو بلوغ المدة التأخيرية نسبة (٢٥%) من مدة العقد الأصلية وبعبارة سيُسحب العمل منكم وينفذ على حد
بأي طريقة كانت وتحملكم فرق البديلين لذا نرجو مراجعتكم إلى قسم الشؤون القانونية في الشركة خلال المدة المذ
أعلاه لغرض توقيع العقد والمباشرة مستصحبين معكم ما يأتي :-

١- التأمينات النظامية : كفالة حسن الأداء نسبة (٥%) من قيمة العقد والبالغة (٢٩,٥٧٠,٠٠٠) تسعة وعشرون ما
وخمسمائة وسبعون الف دينار على شكل خطاب ضمان صادر من مصرف معتمد في العراق ينظم لمصلحة شركتنا وباسمكم أو
مصنق .

٢- تصديق رسم الطابع المالي : البالغ (١,١٨٢,٨٠٠) مليون ومائة واثنان وثمانون الف وثمانمائة دينار والذي
نسبة (٢) (٢) بالآلاف من قيمة العقد

٣- تصديق رسم الطابع الهندسي البالغ: (٢٩٥,٧٠٠) مائتان وخمسة وتسعون الف وسبعمائة دينار والذي يمثل نسبة ٢/١ يالاً
من قيمة العقد

مع التقدير

المدير العام
ابراهيم طه البامرني
٢٠١٠/٧/٧

نسخة منه الى :

- ☞ وزارة الأعمار والإسكان / دائرة المفتش العام . . مع التقدير .
- ☞ وزارة الأعمار والإسكان / شعبة العقود / مركز الوزارة / للعلم . . مع التقدير .
- ☞ وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات / يرجى إعلامنا بتسجيل الشركة المذكورة آنفاً لديكم . . مع التقدير .
- ☞ الهيئة العامة للضرائب / الدخل . . مع التقدير .
- ☞ دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .
- ☞ مكتب المدير العام / للعلم . . مع التقدير .
- ☞ مكتب السيدة المعاون / للعلم . . مع التقدير .
- ☞ قسم التخطيط والمتابعة / مع التقدير .
- ☞ قسم الخدمات الهندسية / لأعداد جدول الكميات . . لطفاً .
- ☞ مشروع الاكتفاء الذاتي في دهوك / الأعلامنا تاريخ المباشرة . . لطفاً .
- ☞ قسم المالية .
- ☞ قسم الشؤون القانونية .
- ☞ الإضبارة / للحفظ .
- ☞ لجنة التعهدات .

ذاتان ٢٠١٠/٧/٧ سابق إحالة إيصال ص ١

العنوان: حي الكيلاني (النهضة) بغداد-مكتب بريد الصالحية/ص.ب ٣٩١٧٨/هاتف ٨١٨٩٧٦١ (تسعة خطوط)/فاكس ٨٨٦٤٣٤٣/البريد الإلكتروني



بسم الله الرحمن الرحيم
مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل



الادارة العامة

فرع البادية

العدد / ١١٠٢ / ب

التاريخ / ١٧ / ١٠ / ٢٠١٢

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل / فرع البادية
الى / وزارة الزراعة/دائرة البيطرة
م/ كفاءة مالية

تحية طيبة ...

نؤيد لكم بان شركة (وجه الخير للمقاولات العامة) لديها حساب جاري
لدينا رقم (٣٣٢١) وان كفائته المالية (جيدة) والمصرف لا يتحمل أي
مسؤولية قانونية ومالية من هذا التأييد .

مع جزيل الشكر والتقدير.....

نسخة منه الى الاضبارة الشخصية

لينا فارس حمزة

عن/فرع البادية/٦٠٧



NO : GC \
DATE : \ \ 20

العدد : ع ح ١٣٤١ /
التاريخ : ١٩ / ١١ / ٢٠١٢

٤- مدة الانجاز //

(٥٠ ايووم) مائة وخمسون يوم تبدأ من تاريخ امرالمباشرة بالعمل.

٥- الغرامات التأخير عن كل يوم تأخير //

(٥٧١٨٩٣ دينار) فقط خمسمائة وأحدى وسبعون الف وثمانمائة وثلاثة وتسعون دينار

٦- فترة الصيانة //

(سنة واحدة) من تاريخ الاستلام الاولي.

تفاصيل الرسوم والتأمينات وأجور الإعلان :-

٠ تأمينات حسن التنفيذ بمبلغ قدره (٤٧١٨١٢٠٠ دينار) فقط سبعة واربعون مليون ومائة واحد وثمانون الف ومئتان دينار وتمثل نسبة (٥%) من المبلغ الاجمالي (مبلغ الاحالة و ١٠% احتياط) وتكون على شكل خطاب ضمان أوصك مصدق أو كفالة مصرفية ضامنة (من مصرف عراقي معتمد).

٠ رسم الطابع المالي بمبلغ قدره (١٧١٥٦٨٠ دينار) فقط مليون وسبعمائة وخمسة عشر الف وستمائة وثمانون دينار وتمثل نسبة (٢.٠٠٠٠٢) اثنان بالالف من مبلغ الاحالة.

٠ رسم الطابع الهندسي بمبلغ قدره (٤٢٨٩٢٠ دينار) فقط أربعمائة وثمانية وعشرون الف وتسعمائة وعشرون دينار وتمثل نسبة (٥.٠٠٠٠٥) نصف بالالف من مبلغ الاحالة.

٠ رسم الطابع العدلي بمبلغ قدره (٥٠٠ دينار) فقط خمسمائة دينار عراقي لاغير.

٠ اجور الإعلان والنشر في الصحف المحلية.



أ. د. امين نواي ثامر

رئيس الجامعة التكنولوجية

الجامعة التكنولوجية
شعبة
العقود الحكومية
الصادرة
العدد
التاريخ: / /

نسخة منه الى/

- وزارة تنظيم المالي والبحث العلمي / دائرة الأعمار والمشاريع/ قسم العقود الحكومية
- وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي/ الجهاز المركزي للإحصاء و دائرة التسييد و التخطيط
- دائرة العمل والشؤون الاجتماعية / دائرة القاعدة والضمان الاجتماعي
- ديوان الرقابة المالية
- قسم الشؤون المالية
- وحدة التعاقدات لإضبارة المناقصة
- ملف الصادرة

NO. : GC \
DATE : \ \ 20

العدد : ع ح ١٣٤١ /
التاريخ : ١٩ / ١١ / ٢٠١٢

٤- مدة الانجاز //

(٥٠ ايووم) مائة وخمسون يوم تبدأ من تاريخ امرالمباشرة بالعمل.

٥- الغرامات التأخير عن كل يوم تأخير //

(٥٧١٨٩٣ دينار) فقط خمسمائة وأحدى وسبعون الف وثمانمائة وثلاثة وتسعون دينار

٦- فترة الصيانة //

(سنة واحدة) من تاريخ الاستلام الاولي.

تفاصيل الرسوم والتأمينات وأجور الاعلان :-

٠ تأمينات حسن التنفيذ بمبلغ قدره (٤٧١٨١٢٠٠ دينار) فقط سبعة واربعون مليون ومائة واحد وثمانون الف ومئتان دينار وتمثل نسبة (٥%) من المبلغ الاجمالي (مبلغ الاحالة و ١٠% احتياط) وتكون على شكل خطاب ضمان أوصك مصدق أو كفالة مصرفية ضامنة (من مصرف عراقي معتمد).

٠ رسم الطابع المالي بمبلغ قدره (١٧١٥٦٨٠ دينار) فقط مليون وسبعمائة وخمسة عشر الف وستمائة وثمانون دينار وتمثل نسبة (٢.٠٠٠٠٢) اثنان بالالف من مبلغ الاحالة.

٠ رسم الطابع الهندسي بمبلغ قدره (٤٢٨٩٢٠ دينار) فقط أربعمائة وثمانية وعشرون الف وتسعمائة وعشرون دينار وتمثل نسبة (٥.٠٠٠٠٥) نصف بالالف من مبلغ الاحالة.

٠ رسم الطابع العدلي بمبلغ قدره (٥٠٠ دينار) فقط خمسمائة دينار عراقي لاغير.

٠ اجور الاعلان والنشر في الصحف المحلية.



أ. د. امين نواي ثامر

رئيس الجامعة التكنولوجية

الجامعة التكنولوجية
شعبته
العقود الحكومية
الصادر
العدد
التاريخ: / /

نسخة منه الى/

- وزارة تنظيم المالي والبحث العلمي / دائرة الأعمار والمشاريع/ قسم العقود الحكومية
- وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي/ الجهاز المركزي للإحصاء و دائرة التسييد و التخطيط
- دائرة العمل والشؤون الاجتماعية / دائرة القاعدة والضمان الاجتماعي
- ديوان الرقابة المالية
- قسم الشؤون المالية
- وحدة التعاقدات لإضبارة المناقصة
- ملف الصادر

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق

وزارة التخطيط

الجهاز المركزي للإحصاء / القسم القانوني

العراق - بغداد - العلوية

هاتف بدالة الجهاز: ٧١٧٤٣٨١-

البريد الإلكتروني: <http://www.iraqcosit.org>

التاريخ: ٢٠١٠/١١/٨

العدد: ١ / ٢ / ١٠ / ١٤٨٦ هـ

إلى / شركة وجه الخير
م / قرار إحالة

يهدىكم الجهاز المركزي للإحصاء أطيب تحياته

استناداً إلى موافقة معالي الوزير المحترم بتاريخ ٢٠١٠/٩/٣ على محضر لجنة العقود المركزية في وزارة التخطيط للقيام بإجراءات التعاقد وإحالة المناقصة رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ على شركتكم لغرض بناء شعبة إحصاء حديثة في محافظة الأنبار (مناقصة عامة) وبمبلغ قدره (٣٦٩,٨٨٤,٥٠٠) (ثلاثمئة وتسعة وستون مليوناً وثمانمئة وأربعة وثمانون ألفاً وخمسمائة دينار عراقي) وبمدة تنفيذ العمل (١٥٠) مئة وخمسون يوماً" لذا يرجى الحضور إلى مقر الجهاز المركزي للإحصاء / القسم القانوني خلال مدة (١٤) يوم من تاريخ الإحالة لتوقيع العقد وبعبءه تتحمل شركتكم كافة التبعات القانونية مستصحبين معكم التأمينات النهائية البالغة (٥%) من قيمة العطاء على شكل صك مصدق أو خطاب ضمان .

مع التقدير

د. مهدي محسن العلق
رئيس الجهاز المركزي للإحصاء



نسخة منه إلى /
القسم القانوني / للمتابعة مع الشركة ... للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير .

عقد المناقصة م.ف.ع. ٢٠١٠/٢
انشاء بناية مقر قاطع صيانة الرمادي

العدد: ١٩

التاريخ: ١٠/١٠/٢٠١٠

استناداً الى أمر الإحالة المرقم (٧٦٥٣) في ١١/١٠/٢٠١٠، حصلت الموافقة على إحالة المناقصة أعلاه بعهددة شركة وجه الخير للمقاولات العامة وكان الإتفاق على ما يلي:
الطرف الأول / المدير العام للمديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية لمنطقة الفرات الأعلى / إضافة لوظيفته أو من يخوله.

الطرف الثاني / شركة وجه الخير للمقاولات العامة المحدودة.
العنوان:- بغداد / السويب / محلة: ٨٦٧ زقاق: ١٢ دار ٤
نقال / ٠٧٩٠١٨٦٢١٧ - ٠٧٧٠٢٥٦٩٢٣٩ - ٠٧٧٠٧٥٠٦٦٤٦
بريد الكتروني / wajhalkear@yahoo.com

أولاً: التزامات الطرف الثاني

- ١- يلتزم الطرف الثاني بإنشاء بناية صيانة الرمادي وحسب التفاصيل المبينة في ملحق هذا العقد والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ منه.
- ٢- تعتبر جدول الكميات الملحق بالعقد والمخططات جزء لا يتجزأ من العقد.
- ٣- يلتزم الطرف الثاني بدفع رسم الطابع بنسبة (٠,٠٠٢) اثنان بالألف من قيمة العقد الكلية وقبل توقيع العقد.
- ٤- يقدم الطرف الثاني كفالة حسن الاداء بنسبة ٥% خمسه بالمائه من قيمة العقد الكلية على شكل خطاب ضمان او صك مصدق من احد المصارف العراقية وقبل توقيع العقد وتطلق بعد نهاية فترة الصيانة.
- ٥- يلتزم الطرف الثاني بدفع الضريبة المقررة قانوناً بنسبة (٣,٣%) ثلاثة وثلاثة من العشرة بالمائة من قيمة العقد الكلية وتطلق عند جلب كتاب يؤيد براءة ذمته المالية من دائرة الضريبة المختصة ولا تصرف الدفعة الأخيرة ولا يسدد الحساب النهائي إلا بموافقة السلطة المالية وفي حالة عدم تقديم براءة الذمة خلال مدة أقصاها (٩٠) تسعون يوماً من تاريخ انجاز التعهد تحال كافة الأمانات المستقطعة إلى القسم المالي في الهيئة العامة للضرائب.
- ٦- لاعلاقه للطرف الاول بارتفاع الاسعار للمواد الانشائية والمواد الاخرى الداخلة في تنفيذ الاعمال ولا يحق للطرف الثاني بمطالبة الطرف الاول بفروقات الاسعار ان وقعت.
- ٧- يلتزم الطرف الثاني بتقديم برنامج تنفيذ سير العمل مثبت فيه تاريخ ابتداء العمل في المشروع ونهايته وحسب جدول الكميات المتفق عليه.
- ٨- يلتزم الطرف الثاني بالقيام بكافة الفحوصات المختبرية وعلى نفقته الخاصة.
- ٩- يتعهد الطرف الثاني بصحة المستمسكات المقدمة من قبله من هويه تصنيف المقاولين واجازة تأسيس الشركة وفي حالة ورود الاجابه من جهة الاصدار عكس ذلك يحق للطرف الاول اتخاذ الاجراءات القانونية ومصادرة التامينات.
- ١٠- ان يقوم بالتامين على اعمال المقاوله من كافة الوجوه والمخاطر وفقاً لما ورد في فقرات التامين التي تضمنتها الشروط العامة لاعمال الهندسة المدنية وان يتم التامين لدى شركة التامين الوطنية قسم التامين الهندسي.
- ١١- توفير كرفان خاص للمهندس المقيم والكادر الاداري للمشروع ويحتوي على (٢) غرفة ومرافق صحية وموصل للكهرباء والماء.
- ١٢- يتم توفير زي موحد للكادر الهندسي المشرف على المشروع
- ١٣- توفير وجبات طعام وماء صالح للشرب للكادر الهندسي المشرف على المشروع.
- ١٤- توفير مولد وذلك لعدم توقف الاعمال عند انقطاع التيار الكهربائي للفقرات التي يحتاج تنفيذها الى التيار الكهربائي.
- ١٥- يخضع هذا العقد لنسبة الرسم الهندسي البالغة (٢/١) نصف بالالف من قيمة العقد.

ثانياً: التزامات الطرف الأول :

- ١- يتم دفع استحقاقات الطرف الثاني على شكل سلف وبموجب الذرعات وحسب قيمة الاعمال المنجزة المطابقة للمواصفات المطلوبة والمؤيدة من قبل دائرة المهندس المقيم للمشروع وبعد نجاحها بالفحوصات الهندسية المطلوبة وفقاً لاحكام التسليف الواردة في القسم الثاني من الشروط العامة لاعمال الهندسة الفنية.
- ٢- يلتزم الطرف الاول بتسليم موقع العمل الى الطرف الثاني لغرض المباشرة وخلال مدة (٥) ايام من تاريخ توقيع العقد ، ويتم تحديد موعد التسليم من قبل لجنة فنية خاصة بتسليم الموقع.

الإدارة العامة
١٠/١٠/٢٠١٠

شركة وجه الخير
١٠/١٠/٢٠١٠



المعد: ش/١٦/٦٩٥
التاريخ: ٢٠١١/٥/٢٤

REF :
DATE :

(الاراضي الرطبة ثروة وطنية.... فلنعمل للمحافظة عليها)
(Wetlands Are National Wealth.... Let us Conserve it))

الى / شركة وجه الخير

م / احالة

نود اعلامكم ان المناقصة المرقمة ن و / ٦ / ٢٠١٠ والخاصة بأنشاء ورشة نموذجية مع غرف ادارية
لقسم صيانة الإنتاج تم احوالها على شركتكم وبمبلغ كلي قدره (٢٥٠,٩٤١,٣٦٣) ثلاثمائة وثلاث
وستون مليون وتسعمائة وواحد واربعون الف ومئتان وخمسون دينار عراقي على ان يتم اكمال كافة
الاجراءات القانونية خلال ١٤ يوما من تاريخ التبليغ .

مع التقدير.....

دلمان نجم عبد الله



المدير العام (وكالة)



السى / شركة وجه الخير للمقاولات العامة المحدودة / عنوانها بغداد / الكرادة / مجاور فندق مرديان م/ ١٠٢/ ز ٤٥
مبنى ٧ ط/ ٢ شقة ٥

مديرها المفوض عبد الجبار احمد محمد - موبايل ٠٧٩٠١٨٦٠٢١٧ - ٠٧٧٠٢٥٦٩٢٣٩

E-mail: wajhalkear@yahoo.com

م/ احالة مناقصة رقم (١٠٤) لسنة ٢٠١٠

((أعمال انشاء دارين جديدين في سد شيرين (الجانب الايمن)))

تحية طيبة .

استناداً الى موافقة هذه الهيئة و اشارة الى عطاءكم المقدم بتاريخ ٢٠١٠/٧/٧ .

١- تكرر احالة أعمال المناقصة اعلاه بعهدتكم وبدون تحفظات وبمبلغ اجمالي قدره ((١٢٤٥٨٧٠٠٠)) فقط مائة واربعة وعشرون مليون وخمسمائة وسبعة وثمانون الف دينار لاغيرها وبمدة تنفيذ امدها (١٥٠) مائة وخمسون يوماً اعتباراً من تاريخ توقيع العقد مضافاً اليها (١٥) يوماً لغرض التهيؤ واستلام الموقع وبموجب شروط المقاوله لاعمال الهندسة المدنية بقسميها الاول والثاني والمخططات وجداول الكميات والشروط الخاصة بالمناقصة .

٢- عليكم مراجعة القسم القانوني في هذه الهيئة خلال مدة (١٤) يوم من تاريخ التبليغ بكتاب الاحالة هذا لغرض توقيع العقد وتسديد اجور الاعلان البالغة (٦٠٠٠٠٠) فقط ستمائة الف دينار ومستصحبين معكم خطاب ضمان عن حسن تنفيذ العمل بمبلغ قدره (٦٢٢٩٣٥٠) فقط ستة ملايين وسبعة وعشرون الف دينار لاغير نافذ لغاية انتهاء المقاوله ولحين صدور شهادة الاستلام النهائي وتزويدنا برقم حساب الشركة واسم المصرف وعنوانه ومراجعة مديرية الاحصاء في المحافظة لتقديم المعلومات الاحصائية واحدى شركات التأمين للتأمين على المقاوله وتقديم مايويد ذلك ومديرية التقاعد والضمان الاجتماعي وصندوق تقاعد المهندسين لتسديد رسم الطابع الهندسي البالغ (٦٢٢٩٤) فقط اثنان وستون الف دينار ومائتان واربعة وتسعون لا غيرورسم الطابع المالي والبالغ (٢٤٩١٧٤) مائتان وتسعة واربعون الف ومائة واربعة وسبعون دينار..... مع التقدير .

المرقات

- مسودة عقد

المدير العام وكالة

فيصل محمد محمد امين

٢٠١٠/٨/١٧

نسخه منه الى

- للتفضل بالعلم ... مع التقدير
- وزارة الموارد المائية / الدائرة القانونية والعقود /
 - دائرة التخطيط والمتابعة /
 - المديرية العامة للخزينة المركزية
 - محافظة كركوك / مكتب السيد المحافظ
 - نقابة المهندسين / صندوق تقاعد المهندسين
 - مديرية الاحصاء في محافظة كركوك
 - الهيئة العامة للضرائب
 - دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي
 - قسم اتصالات و بريد كركوك
 - د.م.م لمد شيرين
 - قسم التخطيط والمتابعة
 - قسم التنفيذ
 - قسم الرقابة الداخلية
 - قسم الحسابات
 - القسم القانوني / مع الاوليات
- للتفضل بالعلم ... رجاءا

لميس ٢٠١٠/٨/١٧



كۆماراڭ عىراق
پاريزگاڭ كركوك
بىشاڭ كاروباراڭ ياسايڭ
هوبىڭ پروژەكان

جمهورية العراق
محافظة كركوك
قسم الشؤون القانونية
شعبة المشاريع

" لنجعل من الاهداف الإنمائية لسنة ٢٠١٢ تمكيناً لذوي الإعاقة في المجتمع "

التاريخ ٢٠١٣ / ٩ / ٨

العدد ٧٣

عقد مقالة

رقم العقد ٧٣ / ٢٠١٣

- اسم العمل :- مشروع (بناء مركز التدريب والاختيار للحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ICDL في كركوك) .
- الطرف الاول/ الدكتور نجم الدين عمر كريم/ محافظ كركوك/ اضافة لوظيفته .
- الطرف الثاني/ شركة (وجه الخير للمقاولات) مديرها المفوض (عبد الجبار احمد محمد) .
- العنوان/ كركوك- عمارة الجدوع / الهاتف (٠٧٧١٨٥٨٠٤٢٦) .
- ١١- اتفق الطرفان على ان يقوم الطرف الثاني بتنفيذ اعمال مشروع (بناء مركز التدريب والاختيار للحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب في كركوك) ضمن خطة الوزارة الاستثمارية لعام ٢٠١٣ البالغ رقماً (٤٤١,٠٤٢,٠٠٠) دينار وكتابة (اربعمائة وواحد واربعون مليون واثنتان واربعون الف دينار) وفق الشروط والمواصفات الفنية المقررة والكشف المنظم بذلك والمخططات الخاصة بالمشروع وحسب ارشادات المهندس المشرف على العمل وتوصيات لجنة الاحالة .
- ٢- الطرف الثاني/ يتعهد بأتمام العمل مدة رقماً (٢٤٠) يوماً وكتابة (مائتان واربعون) يوماً اعتباراً من تاريخ المباشرة بالعمل وخلال مدة (٧) سبعة ايام من تاريخ توقيع العقد .
- ٣- الطرف الثاني/ يتحمل غرامة تاخيرية حسب الشروط العامة للمقاولات قدرها رقماً (١٨٣,٧٦٧) دينار وكتابة (مائة وثلاثة وثمانون الف وسبعمئة وسبعة وستون دينار) عن كل يوم تأخير .
- ٤- الطرف الثاني/ يتحمل مدة صيانة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ انجاز العمل .
- ٥- الطرف الثاني/ يتعهد بتسديد اجور الفحوصات المختبرية الفاشلة والناجحة .
- ٦- الطرف الثاني/ يتعهد بتقديم التأمينات النظامية وفق النسب المقررة قانوناً بشكل نقدي او صك مصدق او خطاب ضمان بالمبالغ المذكورة الى الطرف الاول .
- ٧- الطرف الثاني/ يلتزم بمراجعة دائرة احصاء كركوك لاعطاء المعلومات الخاصة بالمشروع .
- ٨- الطرف الثاني/ يلتزم بمراجعة دائرة الضمان في المحافظة لاعطاء المعلومات الخاصة بالمشروع .
- ٩- الطرف الثاني/ يلتزم بتعيين مهندس له خبرة في العمل المذكور اعلاه من قبله .
- ١٠- الطرف الثاني/ يتعهد بتنفيذ كل ما ورد في العقد وتعتبر بنود العقد مكملة للشروط والمواصفات الخاصة باعمال الهندسة المدنية بقسمها الاول والثاني .
- ١١- الطرف الثاني/ يلتزم بتعيين مهندس له خبرة في العمل المذكور اعلاه من قبله .
- ١٢- الطرف الثاني/ يتعهد بتهيئة دائرة للمهندس المقيم في موقع العمل .
- ١٣- الطرف الثاني/ يتعهد بتهيئة دائرة للمهندس المقيم في موقع العمل .
- ١٤- في حالة عدم تنفيذ الطرف الثاني للمشروع فيتم تنفيذ المشروع على حسابه ويتحمل تحميلات ادارية مقدارها (٢٠ %) من قيمة المبلغ الاجمالي .
- ١٥- في حالة اخلال الطرف الثاني باي شرط من شروط العقد يعتبر العقد مفسوخاً دون الحاجة الى اذاره من قبل الدائرة لأي مدة كانت او اللجوء الى المحاكم المختصة ويتحمل في هذه الحالة كلفة انجاز المشروع عند احواله الى مقاول اخر او يتم تنفيذه من قبل الدائرة على حسابه وليس له الحق في المطالبة باعادة التأمينات .
- ١٦- عدم صرف مبلغ الفقرات الغير متجانسة مع الكشف التخميني للمشروع المعد من قبل الدائرة ووصول نسبة الانجاز الكلي للمشروع الى ٥٠ % .
- ١٧- لايجوز تمديد فترة العمل باي شكل من الاشكال الا اذا وجدت قوة قاهرة لايمكن لأي طرف من الاطراف توقعها او بناء على اعدار قانونية صريحة وتحريرية .
- ١٨- لايجوز التنازل عن اعمال المشروع الا بموافقة الطرف الاول تحريرياً .
- ١٩- الطرف الاول/ له الحق في حذف واستحداث وكذلك الزيادة او النقصان في أي فقرة من فقرات الكشف وحسب مايتطلبه العمل .
- ٢٠- تعتبر اية تعليمات تخص المشروع تصدر الى المقاول من الطرف الاول شروط " ملحقاً " بالعقد واجبة التنفيذ .
- ٢١- يتم استحصاا الديون وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧ .
- ولقبول الطرفين جميع الشروط اعلاه وقع العقد بتاريخ ٢٠١٣ / ٩ / ٥

الطرف الأول
الدكتور نجم الدين عمر كريم
محافظ كركوك اضافة لوظيفته
٢٠١٣ / /

الحقوق محفوظة
الدكتور نجم الدين عمر كريم
محافظ كركوك اضافة لوظيفته
٢٠١٣ / /
www.kirkuk.gov.iq


الطرف الثاني
شركة (وجه الخير للمقاولات)
لعنوان/ كركوك - عمارة الجدوع

محافظ كركوك
قسم الشؤون القانونية
مقدار الرسم المستوفي ١٢٤٥٠٠٠
رقم البوصلة ٣٠١٤٥٠٤٠٤
تاريخه ٢٠١٣ / ١١ / ٨
تسلسله في السجل /

مؤسس الشركة

التوقيع	عدد الأسهم	عبد الجبار احمد محمد			الاسم	١
<i>A</i>	٦٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	عراقية	الجنسية	اعمال حرة	المهنة	
	جيبها الى راس	رقم هوية الاحوال المدنية (مرفق صورة) ٠٠٥٨٨٧١٠ في ١٩ / ٥ / ٢٠٠٨				
	١٠٠ %	رقم جواز السفر (مرفق صورة) في / /				
		العنوان الكامل - البلد - عراقى - بغداد				
	مع تأييدي لصحة المعلومات	المدينة: بغداد - الجزائر - ٥, ٣٢٣ ز. ٤٠, ٥١٩				
	تؤيد صحة التوقيع	ص ب -				

بيان تأسيس
شركة
وجه الخير
للمقاولات العامة محدودة المسؤولية
راسمالها ((600.000.000)) ستمائة مليون دينار

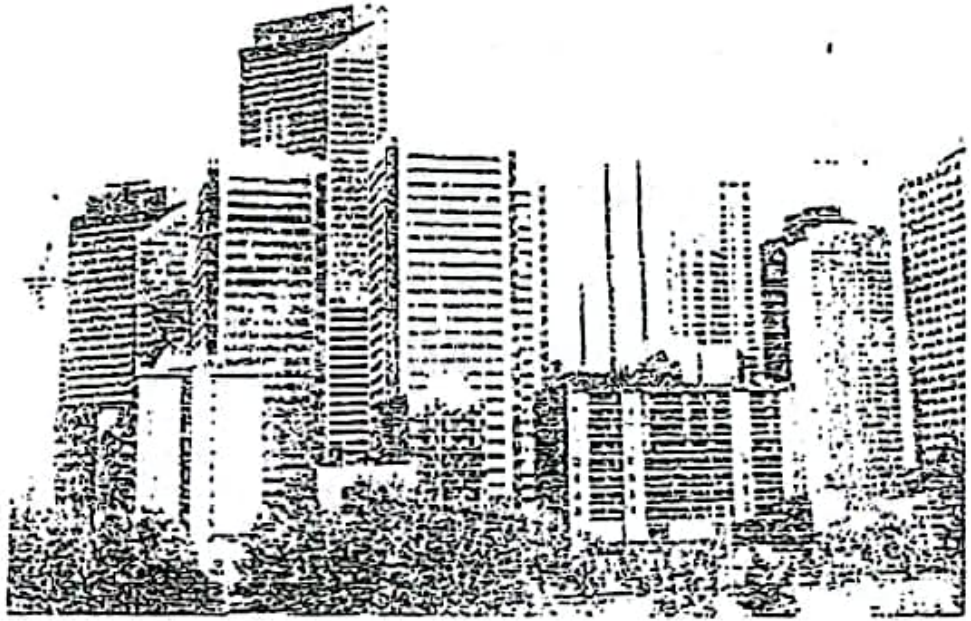

تأسست في مركز سنة ٢٠٠٨

نظم هذا البيان من قبل
المحامي
عبد الحسن الخزرجي

مكتب دائري
د/ ٠٧٦٠٣٩٦٧٤٠١



NO. : GC \
DATE : \ \ 20

العدد : ع ح ١٣٩١ /
التاريخ : ١١ / ١٩ / ٢٠١٢

إلى / شركة وجه الخير للمقاولات العامة المحدودة
العنوان / بغداد - مجاور فندق فلسطين مرديان
موبايل ٠٧٧٩٢٢٢٥٦٢ - ٠٧٧٠٦٠٠٩٠٣٧

E-mail: Wajh alkear @yahoo.com

م/احالة مناقصة رقم (٢) لسنة ٢٠١٣
مشروع (تاهيل وتطوير ابنية الاقسام العلمية والمراكز البحثية والتدريبية القائمة في الجامعة
التكنولوجية/قسم هندسة البناء والانشاءات)

استناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا وبموجب كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم
(ع/٤٦٩٩ في ٢٣/١٠/٢٠١١) وما جاء في محضر لجنة تحليل وتدقيق العطاءات نحيل
إليكم تنفيذ فقرات المناقصة (رقم ٢ لسنة ٢٠١٣) المدونة تفاصيلها في أنناه راجين حضوركم
إلى رئاسة الجامعة/شعبة العقود الحكومية خلال فترة (١٤ يوم) عشر يوماً من تاريخ تبليغكم
بقرار الاحالة لتسديد الرسوم والتأمينات وإكمال إجراءات التعاقد وبخلافه يتم توجيه أنذار
بضرورة توقيع العقد وبعد انتهاء المدة القانونية للأنذار تعتبرون ناكلين وستتخذ كافة الإجراءات
القانونية بحكم.

التفاصيل:

١- التبويب //

المادة (٥) النوع (٢) تفصيل النوع (٣) التسلسل (٢٥)

٢- اسم المشروع الرئيسي //

مشروع تاهيل وتطوير ابنية الاقسام العلمية والمراكز البحثية والتدريبية القائمة في الجامعة التكنولوجية/
قسم هندسة البناء والانشاءات)

٣- المبلغ مفصلاً //

أ- مبلغ الاحاله (٨٥٧٨٤٠٠٠٠ دينار) فقط ثمانمائة وسبعة وخمسون مليون وثمانمائة وأربعون
الف دينار.

ب- المبلغ الإجمالي (٩٤٣٦٢٤٠٠٠ دينار) فقط تسعمائة وثلاثة واربعون مليون وستمائة وأربعة
وعشرون الف دينار.

الجامعة التكنولوجية
شعبة
العقود الحكومية

IRAQ - BAGHDAD
www.uotechnology.edu.iq/goveconts



العراق - بغداد

التاريخ: / /



لكمال

بسم الله الرحمن الرحيم



جمهورية العراق
رئاسة ديوان الوقف السني
دائرة الشؤون الهندسية

العدد ١٠٩٤
القسم
التاريخ الهجري / /
التاريخ الميلادي ٢٠١٠ / ٨ / ١٤٢

المشاريع

شركة وجه الخير للمقاولات العامة
بغداد / البتاوين / م / ١٠٢ شارع ٤٥ عمارة ٧
موبايل / ٠٧٧٠٧٥٠٦٦٤٦ / ٠٧٧٠٢٥٦٩٢٣٩
م / انتهاءات كلية البنات / جامعة الامام الاعظم

حصلت الموافقة على تصديق أحالة العمل اعلاه بعهدتكم بسعر عطاءكم البالغ ١٢١٢٩٧٣٥٠٠ مليار ومئتا
واثنا عشر مليون وتسعمائة وثلاثة وسبعون الف وخمسمائة دينار وخمسة عشر الف دينار وبمدة تنفيذ ١٥٠
مائة وخمسون يوما راجين مراجعة قسم العقود وشركة التأمين الوطنية لغرض إجراء التعاقد

المرفقات
١ / كشف

لؤي كمال جواد
المدير العام لدائرة الشؤون الهندسية

٢٠١٠ / ٨ / ١٤

نسخة منه الى

مكتب السيد معاون رئيس الديوان للشؤون الدينية / موافقتكم بتاريخ ٢٠١٠ / ٢ / ٢ للتفضل بالاطلاع مع
التقدير

مكتب السيد المفتش العام / مكتب الهندسية للتفضل بالاطلاع مع التقدير .

مكتب السيد المدير العام

مكتب السيد معاون المدير العام } للتفضل بالاطلاع مع التقدير .

وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي / دائرة التشييد والخدمات والإسكان

الهيئة العامة للضرائب

مدير قسم المشاريع

قسم المشاريع

قسم العقود / مع الأوليات والعطاءات كافة لأجراء التعاقد مع الشركة اعلاه

قسم التخطيط والمتابعة / مع نسخة من الكشف

حسابات الخطة / حصلت موافقة معاون رئيس الديوان للشؤون الدينية بتاريخ ٢٠١٠ / ٢ / ٢

الجهز المركزي للإحصاء

مديرية إحصاء بغداد

مديرية ضمان بغداد

شركة التأمين الوطنية

فاطمة ٢٠١٠ / ٢ / ٧



NO. : GC \
DATE : \ \ 20

العدد : ع ح ١٣٩١ /
التاريخ : ١١ / ١٩ / ٢٠١٢

إلى / شركة وجه الخير للمقاولات العامة المحدودة
العنوان / بغداد - مجاور فندق فلسطين مرديان
موبايل ٠٧٧٩٢٢٢٥٦٢ - ٠٧٧٠٦٠٠٩٠٣٧

E-mail: Wajh alkear @yahoo.com

م/احالة مناقصة رقم (٢) لسنة ٢٠١٣
مشروع (تاهيل وتطوير ابنىة الاقسام العلمية والمراكز البحثية والتدريبية القائمة في الجامعة
التكنولوجية/قسم هندسة البناء والانشاءات)

استناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا وبموجب كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم
(ع/٤٦٩٩ في ٢٣/١٠/٢٠١١) وما جاء في محضر لجنة تحليل وتدقيق العطاءات نحيل
إليكم تنفيذ فقرات المناقصة (رقم ٢ لسنة ٢٠١٣) المدونة تفاصيلها في أنناه راجين حضوركم
إلى رئاسة الجامعة/ شعبة العقود الحكومية خلال فترة (١٤ يوم) عشر يوماً من تاريخ تبليغكم
بقرار الاحالة لتسديد الرسوم والتأمينات وإكمال إجراءات التعاقد وبخلافه يتم توجيه أنذار
بضرورة توقيع العقد وبعد أنتهاء المدة القانونية للأنذار تعتبرون ناكلين وستتخذ كافة الإجراءات
القانونية بحكم.

التفاصيل :

١- التبويب //

المادة (٥) النوع (٢) تفصيل النوع (٣) التسلسل (٢٥)

٢- اسم المشروع الرئيسي //

مشروع تاهيل وتطوير ابنىة الاقسام العلمية والمراكز البحثية والتدريبية القائمة في الجامعة التكنولوجية/
قسم هندسة البناء والانشاءات)

٣- المبلغ مفصلاً //

أ- مبلغ الاحاله (٨٥٧٨٤٠٠٠٠ دينار) فقط ثمانمائة وسبعة وخمسون مليون وثمانمائة وأربعون
الف دينار.

ب- المبلغ الإجمالي (٩٤٣٦٢٤٠٠٠ دينار) فقط تسعمائة وثلاثة واربعون مليون وستمائة وأربعة
وعشرون الف دينار.


الجامعة التكنولوجية
شعبة
العقود الحكومية

IRAQ - BAGHDAD
www.uotechnology.edu.iq/goveconts



العراق - بغداد

التاريخ : / /

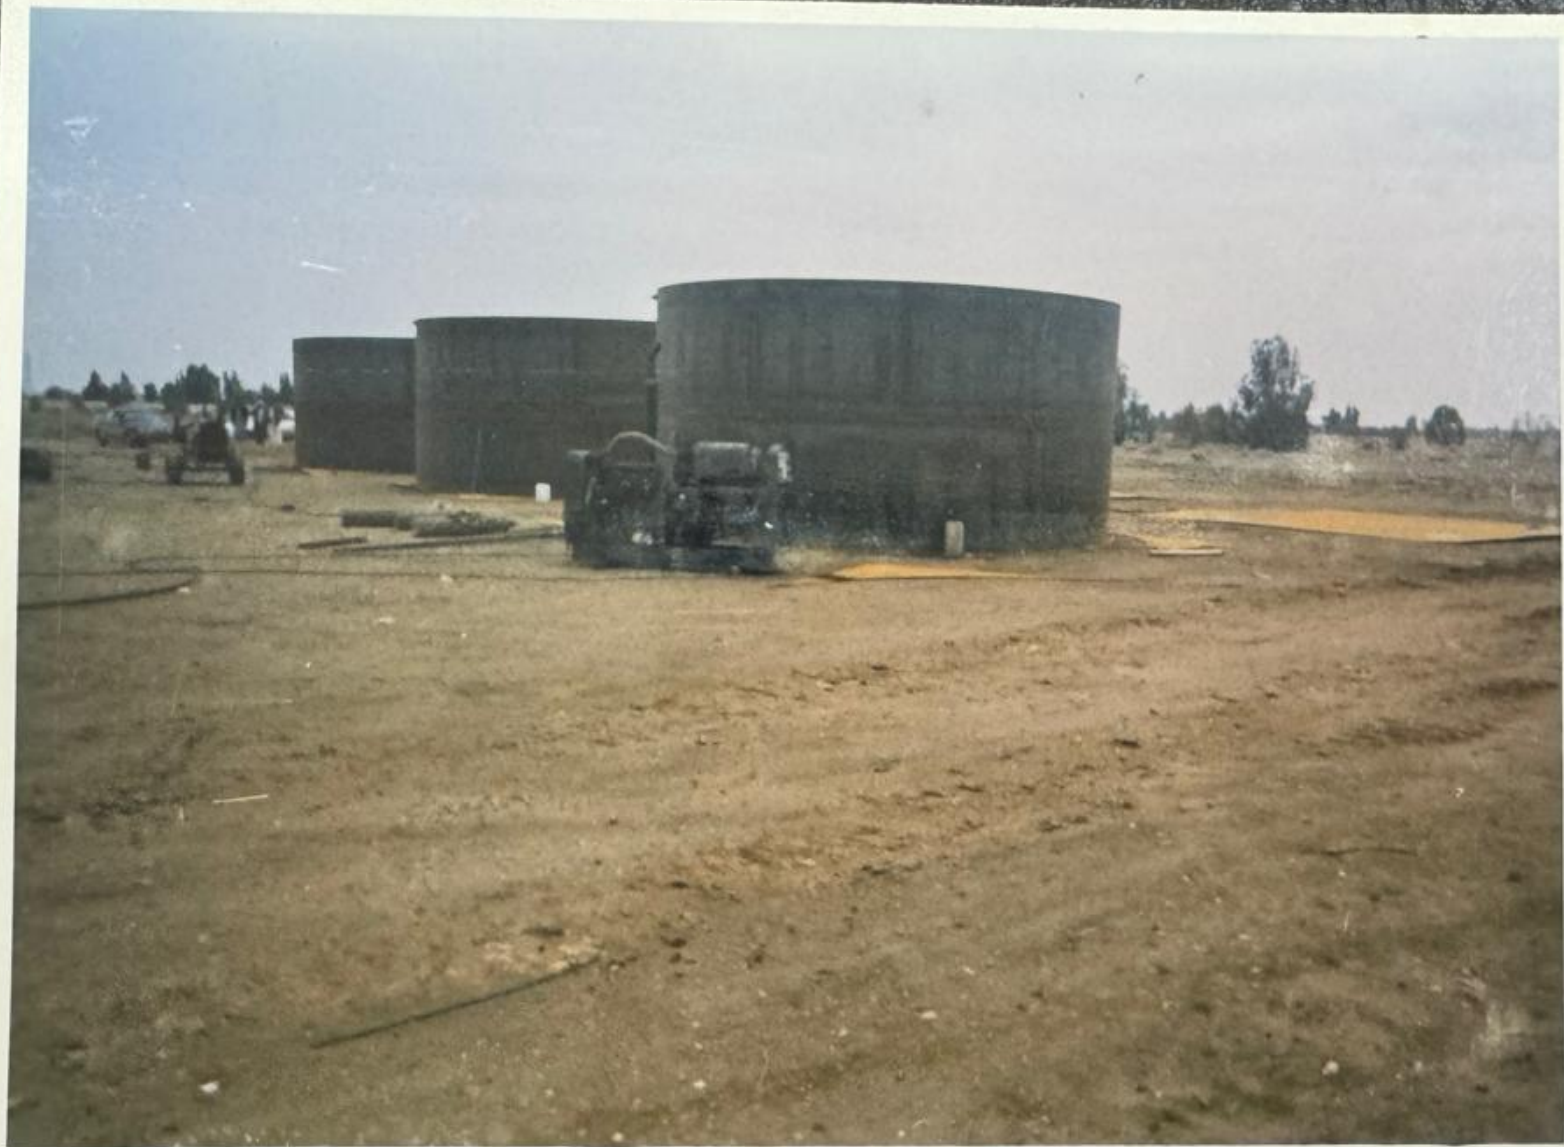
















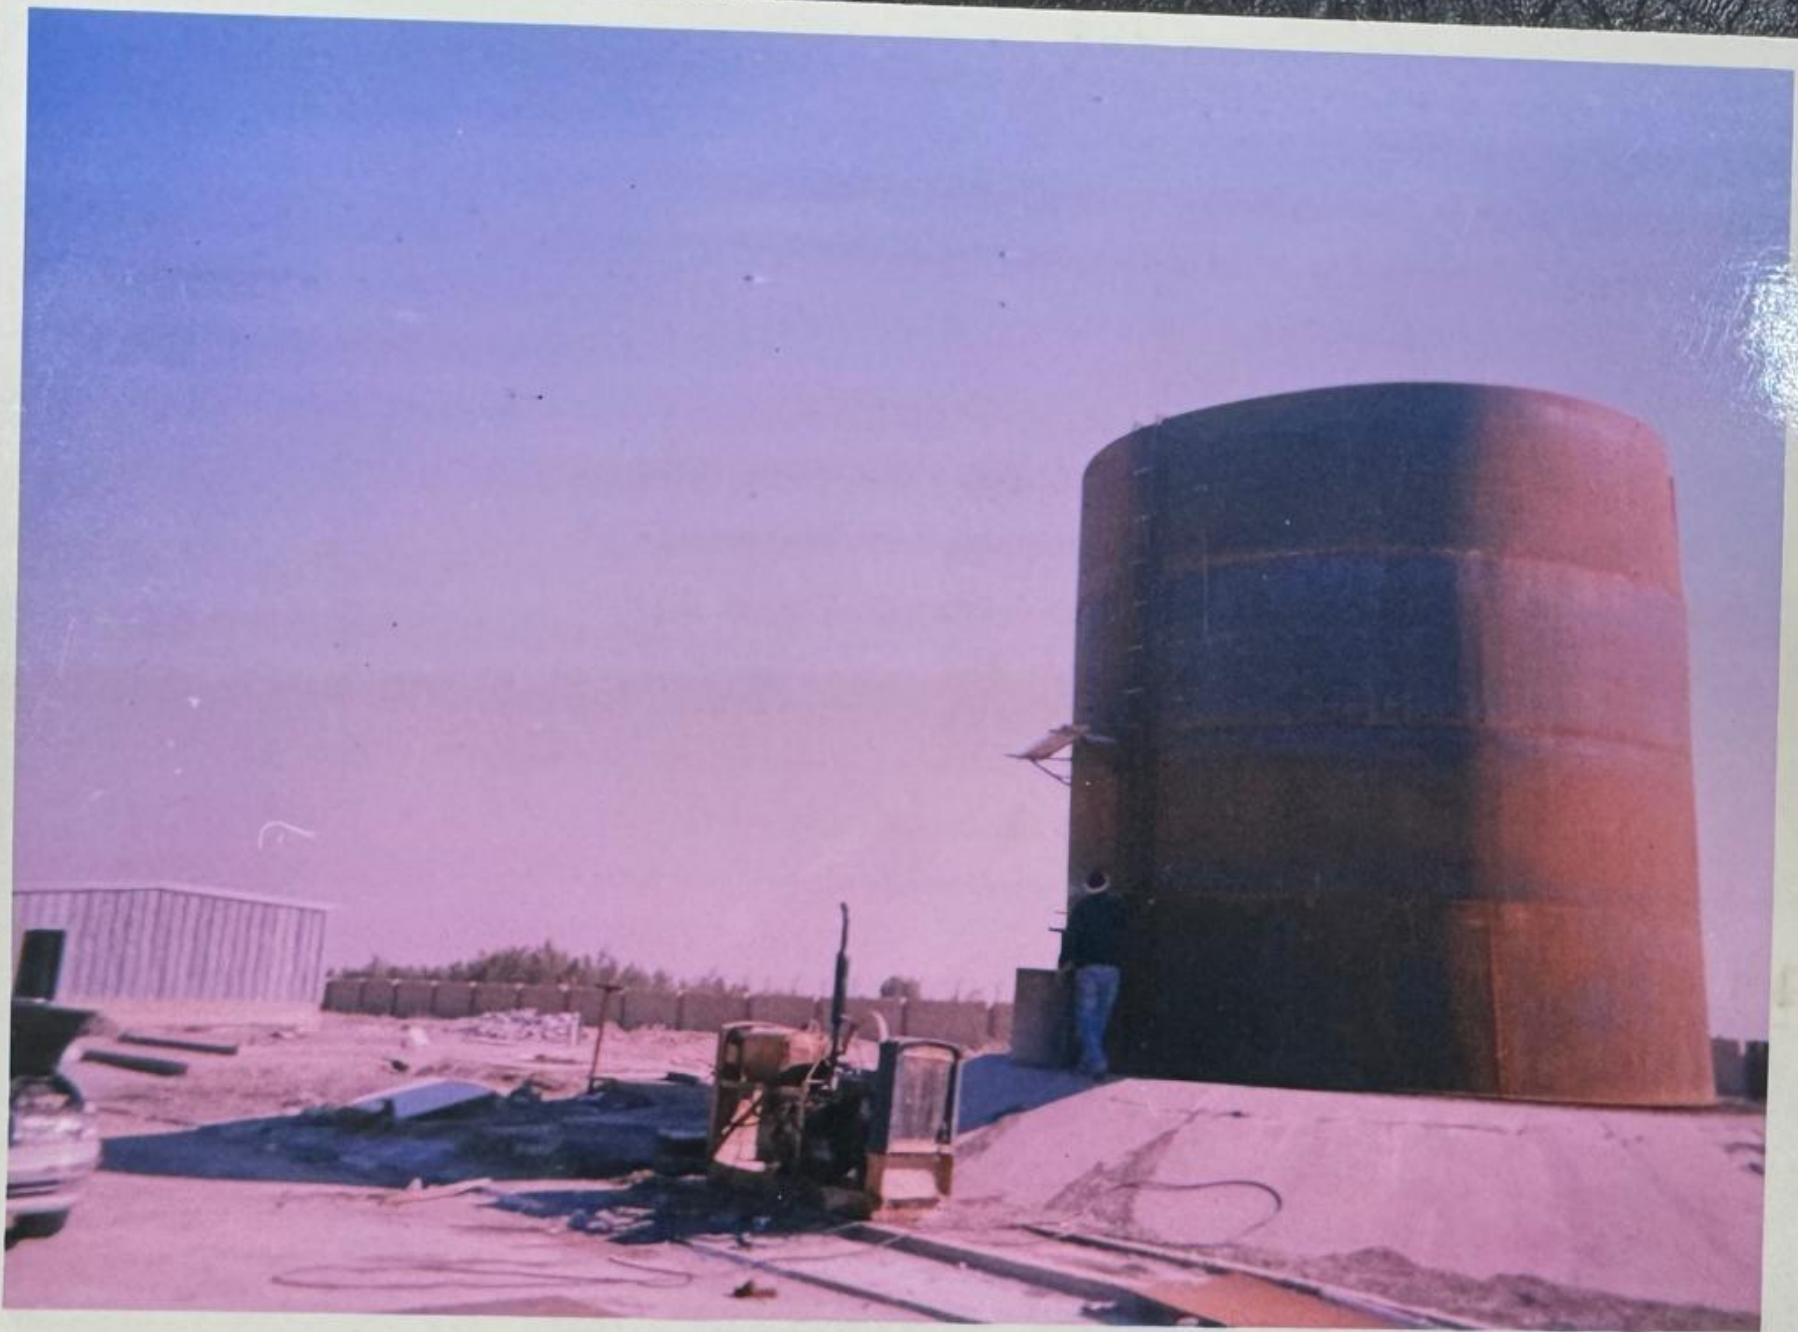








كلية الإمام الأعظم الجامعة

بغداد



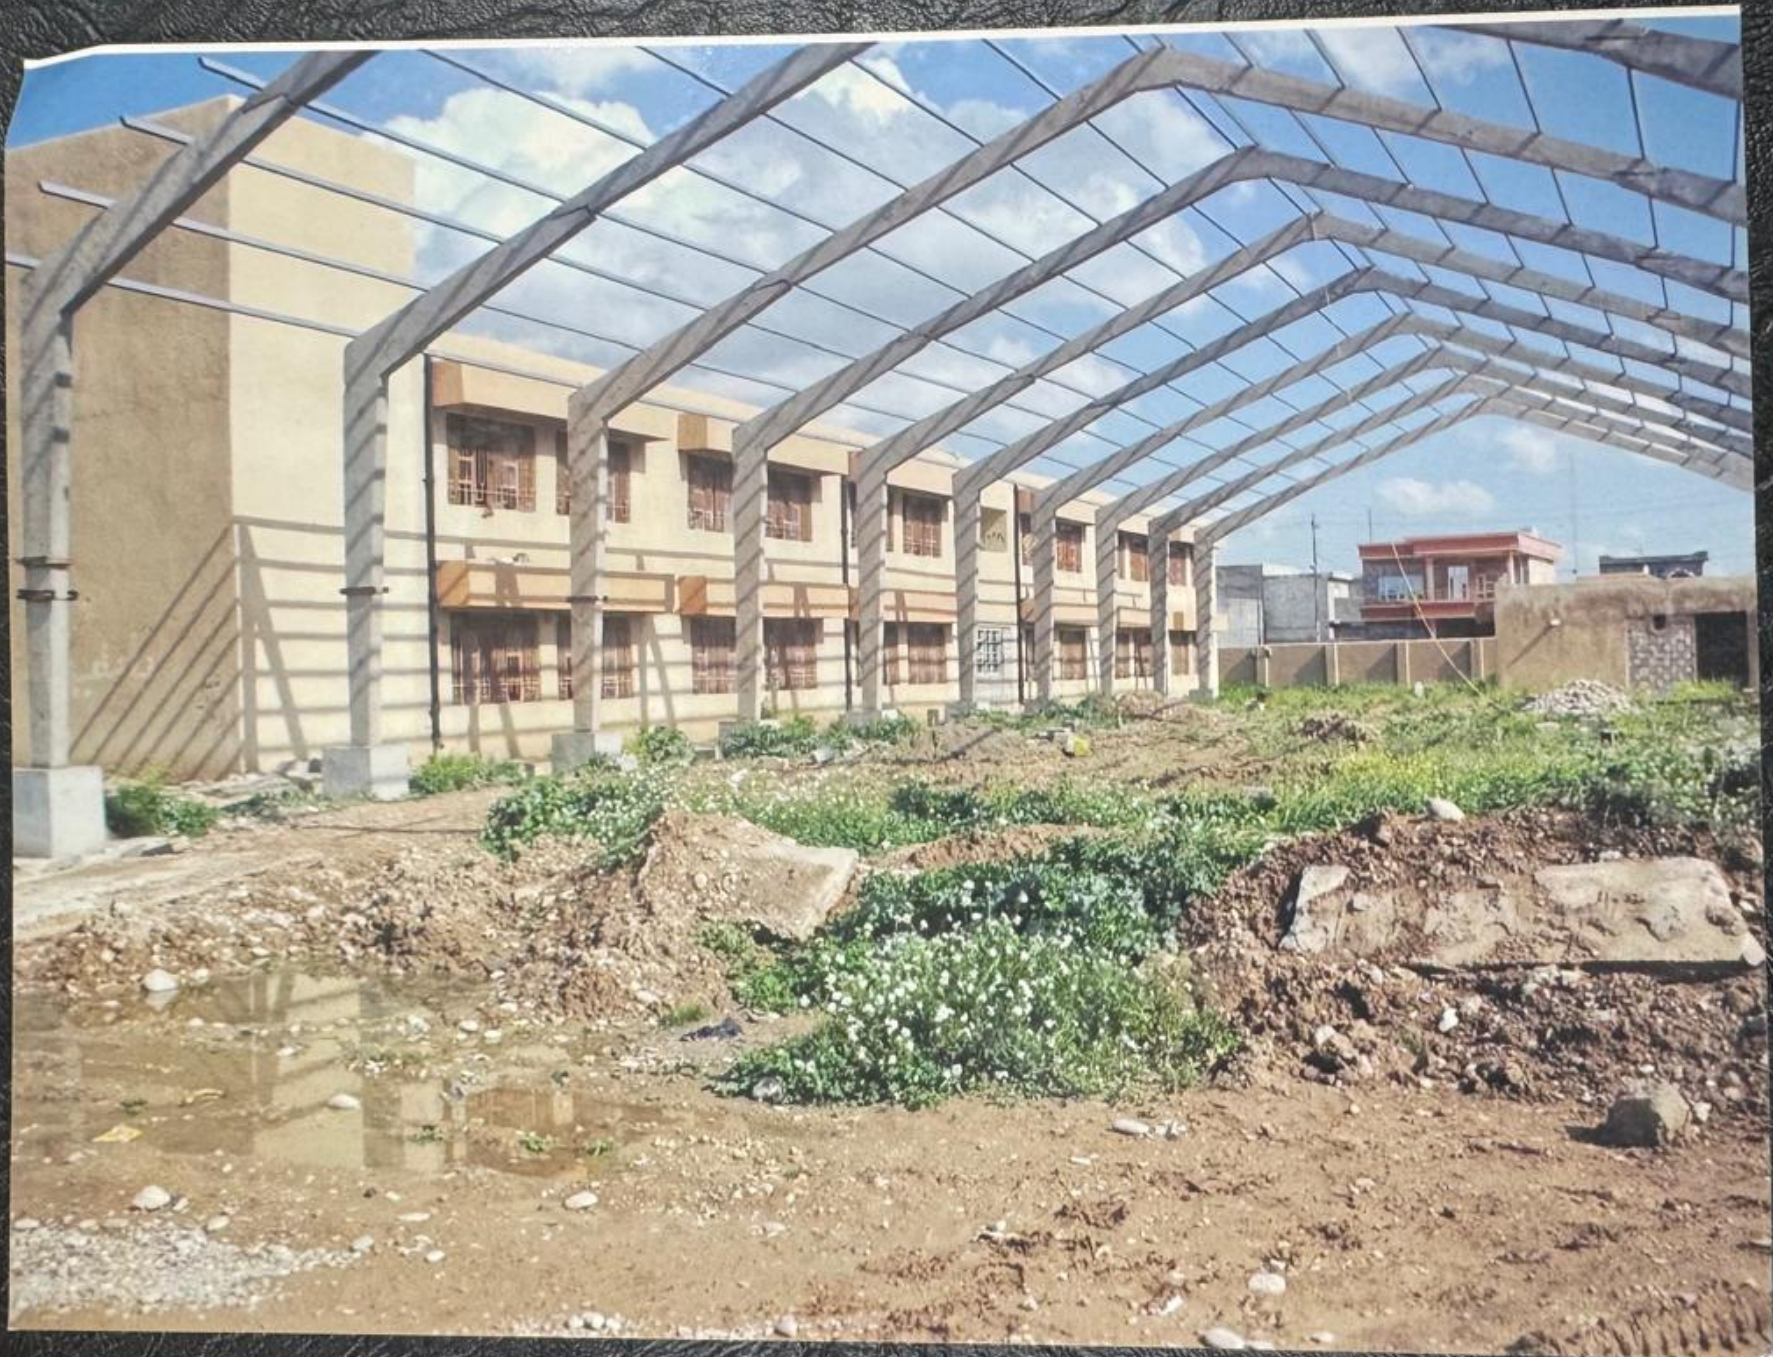























كلية الإمام الأعظم الجامعة بغداد

